

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1



PERÍODO: 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA.

**CONSORCIO INTERVIAL
Contrato de Interventoría No.
CO1.PCCNTR.6692037**

	CARGO	NOMBRE	FECHA	VERSIÓN	FIRMA
ELABORÓ	Res. de interventoría	Nicolás Ramírez Burgos	07/11/2024	V01	<i>Nicolás Ramírez Burgos</i>
REVISÓ	Representante legal	Juan David Aldana	07/11/2024	V01	<i>Juan David Aldana</i>

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	4
1.1. Contrato 843 de 2023 - lote 1	4
1.1.1. Información general	4
1.1.2. Vigencia de las garantías	5
1.1.3. Valor actas de cobro	5
1.2. Contrato 844 de 2023 - lote 2	5
1.2.1. Información general del contrato	5
1.2.2. Vigencia de las garantías	7
1.2.3. Valor actas de cobro	8
1.3. Contrato 845 de 2023 – Lote 3	8
1.3.1. Información general del contrato	8
1.3.2. Vigencia de las garantías	10
1.3.3. Valor actas de cobro	11
1.4. Contrato CO1.PCCNTR.6692037 (Interventoría)	11
1.4.1. Información general del contrato	11
1.4.2. Vigencia de las garantías	11
1.4.3. Valor actas de cobro	12
2. ÁREA TÉCNICA	12
2.1. Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas.	12
2.1.1. Lote 1	12
2.1.1.1. Control de Programación	13
2.1.1.2. Control de Equipos y maquinaria	13
2.1.1.3. Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones	13
2.1.1.4. Resultados de ensayos y pruebas	13
2.1.1.5. Comentarios y Recomendaciones	13
2.1.2. Lote 2	13
2.1.2.1. Control de Programación	15
2.1.2.2. Control de Equipos y maquinaria	17
2.1.2.3. Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones	18

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com

2.1.2.4.	Resumen de Ensayos y Pruebas	19
2.1.2.5.	Comentarios y Recomendaciones	21
2.1.3.	Lote 3	21
2.1.3.1.	Control de Programación	24
2.1.3.2.	Control de Equipos y maquinaria	24
2.1.3.3.	Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones	24
2.1.3.4.	Resumen de Ensayos y Pruebas	24
2.1.3.5.	Comentarios y Recomendaciones	24
3.	AREA ADMINISTRATIVA	24
3.1.	Actas de comités de obra	24
3.2.	Resumen del estado del contrato y subcontratos	24
3.2.1.	Lote 1	25
3.2.2.	Lote 2	26
3.2.3.	Lote 3	27
3.2.4.	Interventoría	28
3.3.	Información sobre personal, equipos e insumos	28
3.3.1.	Personal	28
3.3.2.	Equipos e insumos	29
4.	AREA CONTABLE Y FINANCIERA	30
4.1.	Control de presupuesto e inversión	30
4.2.	Reporte de multas y sanciones	31
4.3.	Comentarios y recomendaciones	31

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual tiene como objetivo presentar el avance y seguimiento de las actividades correspondientes al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.6692037, cuyo objeto es la “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio de Chía, Cundinamarca”. Este contrato es de vital importancia para garantizar la correcta ejecución de las obras de mejoramiento vial en el municipio, con el fin de mejorar la infraestructura de transporte y, por ende, la calidad de vida de los habitantes.

La interventoría abarca diversas áreas, como la supervisión técnica y administrativa de las obras, el control financiero de los recursos, el cumplimiento de las normativas ambientales, y la implementación de estrategias de seguridad y salud en el trabajo. **Este informe detalla los avances obtenidos durante el período comprendido entre el 08 de octubre y 07 de noviembre de 2024**, identificando las acciones realizadas, los resultados obtenidos, y los posibles desafíos encontrados, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato y de contribuir al éxito del proyecto.

A través de este informe, se busca ofrecer un panorama claro y actualizado de la situación actual del proyecto, proporcionando información relevante para la toma de decisiones y el adecuado desarrollo de las obras de mejoramiento vial en Chía.

El contenido del presente informe obedece a los requerimientos documentales establecidos en el numeral 7 de la Cláusula 10 del Anexo Técnico del Contrato de interventoría.

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	

1. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta la información general de los contratos de obra e interventoría:

1.1. Contrato 843 de 2023 - lote 1

1.1.1. Información general

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA No. LP 011-2023
NUMERO DE CONTRATO	843 – 2023
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA – FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO.
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRA BELCONS
NIT	901.771.211 – 3
E-MAIL	consorcioinfrabel@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN ORLANDO GUTIÉRREZ SALCEDO
DIRECCIÓN	CL 125 NRO. 45 A - 08 PISO 2, BOGOTÁ D.C.
ESTADO	PENDIENTE POR ACTA DE INICIO
VALOR	SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$626.610.584,00 M/CTE).
FECHA DE INICIO	PENDIENTE POR ACTA DE INICIO
PLAZO CONTRACTUAL	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACION	PENDIENTE

- **TRAMO 1 (Convenio ICCU 932 de 2022):** Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección Tíquiza – Fagua sector Ancianato La Macarena del Municipio de Chía – Cundinamarca.



COORDENADA INICIAL		COORDENADA FINAL	
4° 53'12"N	74° 03'40"O	4° 53'08"N	74° 03'34"O

- **TRAMO 2 (Convenio ICCU 907 de 2022):** Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección de la vía Resguardo Indígena a la Vereda Fonquetá sector Pueblo Fuerte del Municipio de Chía, Cundinamarca.



COORDENADA INICIAL		COORDENADA FINAL	
4° 51'45"N	74° 04'55"O	4° 51'51"N	74° 04'50"O

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	

1.1.2. Vigencia de las garantías

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - SEGUROS DEL ESTADO S.A			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	11-44-101237005	29/12/2023	29/06/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	11-44-101237005	29/12/2023	01/03/2027
Estabilidad y/o calidad de obra	11-44-101237005	01/03/2024	01/03/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	11-44-101069022	29/12/2023	29/02/2024

Al corte del informe las pólizas no se encuentran vigentes. Se realiza seguimiento a las garantías y seguros, durante el periodo de reporte la interventoría emitió los siguientes requerimientos al contratista con el fin de que alleguen las respectivas pólizas actualizadas y así poder continuar con el trámite de suscripción de acta de inicio:

- CIV-001-2024, asunto: Solicitud de actualización de pólizas Lote 1, 15/10/24.
- CIV-004-2024, asunto: Reiteración No. 1 a solicitud de actualización de pólizas Lote 1, 21/10/24.

El contratista de obra del Lote 1 manifestó que, aunque está dispuesto a dar cumplimiento a las obligaciones del contrato, la aseguradora solicitó el envío de la correspondiente acta de inicio para dar trámite a la actualización (oficio CI-B005-2024 del 24 de octubre) lo cual se encuentra actualmente dentro de los tiempos de trámite por parte del área de contratación de la alcaldía municipal.

1.1.3. Valor actas de cobro

A la fecha de corte del presente informe se tiene la siguiente información con respecto a las actas de cobro del contratista:

N°	Fecha	Valor acta	Estado	Observación
N/A	N/A	N/A	N/A	No se ha presentado acta de cobro durante el periodo
TOTAL	N/A	N/A	N/A	

1.2. Contrato 844 de 2023 - lote 2

1.2.1. Información general del contrato

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA No. LP 011-2023
N° DE CONTRATO	844 – 2023
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR PUENTE SAN FERMÍN; DE LA VÍA QUE DE LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ CONDUCE A LA VEREDA YERBABUENA SECTOR QUEBRADA HONDA; DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR LA "Y" Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL CAGUÁN

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	

CONTRATISTA	A&N INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT	901.508.126 – 1
E-MAIL	aznesas@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ERASMO ÁLVAREZ ARROYO
DIRECCIÓN	CL 17 NRO. 07 - 20 NORTE BARRIO GUAYABAL, SAN BERNARDO DEL VIENTO
ESTADO	EN EJECUCIÓN
VALOR	OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$864.144.358,00 M/CTE).
FECHA DE INICIO	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO CONTRACTUAL	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACION	02 DE FEBRERO DE 2025

- **TRAMO 3 (Convenio ICCU 992 de 2022):** Mejoramiento de la vía que de la Parroquia La Santa Cruz conduce a la Vereda Yerbabuena sector Quebrada Honda del Municipio de Chía, Cundinamarca.



COORDENADA INICIAL	COORDENADA FINAL
4°51'31.41"N 74°00'43.85"O	4°51'27.64"N 74°00'47.31"O

- **TRAMO 4 (Convenio ICCU 993 de 2022):** Mejoramiento de la vía que de la Vereda Yerbabuena conduce a la Vereda Fusca sector Puente San Fermín del Municipio de Chía, Cundinamarca.



COORDENADA INICIAL	COORDENADA FINAL
4°51'27.91"N 74°00'46.33"O	4°51'21.07"N 74°00'50.69"O

- **TRAMO 5 (Convenio ICCU 986 de 2022):** Mejoramiento de la vía que de la Vereda Yerbabuena conduce a la Vereda Fusca sector de la "Y" del Municipio de Chía, Cundinamarca.



COORDENADA INICIAL	COORDENADA FINAL
4°51'16.08"N 74°00'51.36"O	4°51'09.14"N 74°00'54.8"O

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	

- **TRAMO 6 (Convenio ICCU 987 de 2022):** Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la Vereda Yerbabuena sector El Caguán del Municipio de Chía, Cundinamarca.



COORDENADA INICIAL	COORDENADA FINAL
4°50'53.09"N 73°59'53.99"O	4°50'57.34"N 73°59'46.86"O

1.2.2. Vigencia de las garantías

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – SEGUROS DEL ESTADO S.A			
POLIZA	Nº	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	53-44-101297768	28/12/2023	30/09/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	53-44-101297768	28/12/2023	28/03/2027
Estabilidad y/o calidad de obra	53-44-101297768	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días.	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	53-40-101009803	28/12/2023	30/03/2024

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – INICIAL- SEGUROS DEL ESTADO S.A			
POLIZA	Nº	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	53-44-101297768	17/10/2024	21/07/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	53-44-101297768	17/10/2024	16/01/2028
Estabilidad y/o calidad de obra	53-44-101297768	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días.	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	53-40-101011269	17/10/2024	17/01/2025

La interventoría realizó los siguientes requerimientos formales al contratista de obra con el fin de lograr la actualización de las garantías:

- CIV-002-2024, asunto: Solicitud de actualización de pólizas Lote 2, 15/10/24.
- CIV-005-2024, asunto: Reiteración No. 1 a solicitud de actualización de pólizas Lote 2, 21/10/24.

El contratista manifestó la necesidad de suscribir el acta de inicio para actualizar las garantías por solicitud de la entidad aseguradora, adicionalmente, la interventoría emitió un concepto por solicitud del contratista y la entidad aseguradora sobre la línea de tiempo del contrato y los causales de no inicio del contrato de obra, con el fin de aclarar la situación ante la entidad aseguradora y buscar alguna alternativa viable (CIV-007-2024 REIT 1 Y ACLARC. SOL. ACTUALIZACION POLIZAS LOTE 2 del 22 de noviembre). no obstante, el contratista desistió de la actualización y decidió adquirir las nuevas pólizas con el respectivo sobrecosto, con el fin de agilizar el inicio de obra toda vez que

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com

se encontraba en proceso de coordinación logística de materiales y no deseaba retrasar más la obra. La supervisión solicita al área de contratación el 28 de octubre la revisión de pólizas. Las pólizas se encuentran al día y el contratista inició actividades de obra.

1.2.3. Valor actas de cobro

A la fecha de corte del presente informe se tiene la siguiente información con respecto a las actas de cobro del contratista:

Nº	Fecha	Valor acta	Estado	Observación
N/A	N/A	N/A	N/A	No se ha presentado acta de cobro durante el periodo
TOTAL	N/A	N/A	N/A	

1.3. Contrato 845 de 2023 – Lote 3

1.3.1. Información general del contrato

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA No. LP 011-2023
NUMERO DE CONTRATO	845 – 2023
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR RINCÓN ALPINO; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR PARCELACIÓN PAN DE AZÚCAR; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCAL AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR HACIENDA LA MARÍA; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL MIRADOR EL INFIERNITO Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL PÓRTICO
CONTRATISTA	CONSORCIO VICUÑA
NIT	901.775.988 – 5
E-MAIL	licitacionesivg@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL	ISAIAS VARGAS GONZÁLEZ
DIRECCIÓN	CARRERA 4 No 2 - 85 KM. 3.2 PALERMO
ESTADO	PENDIENTE ACTA DE INICIO
VALOR	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOSNOVENTAY SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$1.299.697.206,00 M/CTE).
FECHA DE INICIO	PENDIENTE POR ACTA DE INICIO
PLAZO CONTRACTUAL	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACION	PENDIENTE

- **TRAMO 7 (Convenio ICCU 873 de 2022):** Mejoramiento de la vía que conduce de la Institución Educativa Fusca al Parque Natural La Montaña del Oso de la vereda Yerbabuena sector Hacienda La María del Municipio de Chía.

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	



COORDENADA INICIAL	COORDENADA FINAL
4°51'6.51"N 74°0'9.15"O	4°50'58.85"N 74°0'8.35"O

- **TRAMO 8 (Convenio ICCU 871 de 2022):** Mejoramiento de la vía que conduce de la Institución Educativa Fusca al Parque Natural La Montaña del Oso de la vereda Yerbabuena sector Parcelación Pan de Azúcar del Municipio de Chía.



COORDENADA INICIAL	COORDENADA FINAL
4°50'41.13"N 74°0'21.33"O	4°50'34.51"N 74°0'25.06"O

- **TRAMO 9 (Convenio ICCU 975 de 2022):** Mejoramiento de la vía que conduce de la Institución Educativa Fusca al Parque Natural La Montaña del Oso de la vereda Yerbabuena sector Finca El Descanso del Municipio de Chía.



COORDENADA INICIAL	COORDENADA FINAL
4°50'13.96"N 74°0'32.46"O	4°50'6.75"N 74°0'31.32"O

- **TRAMO 10 (Convenio ICCU 872 de 2022):** Mejoramiento de la vía que conduce de la Institución Educativa Fusca al Parque Natural La Montaña del Oso de la vereda Yerbabuena sector El Pórtico del Municipio de Chía.



COORDENADA INICIAL	COORDENADA FINAL
4°50'2.53"N 74°0'30.23"O	4°49'56.56"N 74°0'30.51"O

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	

- **TRAMO 11 (Convenio ICCU 877 de 2022):** Mejoramiento de la vía que conduce de la Institución Educativa Fusca al Parque Natural La Montaña del Oso de la vereda Yerbabuena sector Rincón Alpino del Municipio de Chía.



COORDENADA INICIAL		COORDENADA FINAL	
4°49'52.60"N	4°49'52.60"N	4°49'45.57"N	74°0'33.79"O

- **TRAMO 12 (Convenio ICCU 934 de 2022):** Mejoramiento de la vía que conduce de la Institución Educativa Fusca al Parque Natural La Montaña del Oso de la vereda Yerbabuena sector Mirador El Infiernito del Municipio de Chía.



COORDENADA INICIAL		COORDENADA FINAL	
4°49'42.16"N	74°0'36.61"O	4°49'35.61"N	74°0'40.50"O

1.3.2. Vigencia de las garantías

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - SEGUROS DEL ESTADO S.A			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	CHU-100013146	28/12/2023	13/10/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	CHU-100013146	28/12/2023	13/04/2027
Estabilidad y/o calidad de obra	CHU-100013146	13/04/2024	13/04/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	CHU-100002668	28/12/2023	13/04/2024

Al corte del informe las pólizas no se encuentran vigentes. Se realiza seguimiento a las garantías y seguros, durante el periodo de reporte la interventoría realizó los siguientes requerimientos al contratista de obra con el fin de que alleguen las respectivas pólizas actualizadas y así poder continuar con el trámite de suscripción de acta de inicio:

- CIV-003-2024, asunto: Solicitud de actualización de pólizas Lote 3, 15/10/24
- CIV-006-2024, asunto: Reiteración No. 1 a solicitud de actualización de pólizas Lote 3, 21/10/24.

El contratista de obra manifestó que la entidad aseguradora solicitó el envío de la correspondiente acta de inicio para dar trámite a la actualización de las garantías, lo

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com

cual se encuentra actualmente dentro de los tiempos de análisis y trámite por parte del área de contratación de la alcaldía municipal.

1.3.3. Valor actas de cobro

A la fecha de corte del presente informe se tiene la siguiente información con respecto a las actas de cobro del contratista:

Nº	Fecha	Valor acta	Estado	Observación
N/A	N/A	N/A	N/A	No se ha presentado acta de cobro durante el periodo
TOTAL	N/A	N/A	N/A	

1.4. Contrato CO1.PCCNTR.6692037 (Interventoría)

1.4.1. Información general del contrato

NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.6692037
PROCESO	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CMA No.001-2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVIAL
NIT	901864642 – 4
REPRESENTANTE LEGAL	R/L DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ R/L SUP. JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
DIRECCIÓN	CR 53 82 86 OF 406 ED OCEAN TOWER
TELEFONO	322 3649162 – 3118768740
E-MAIL	amv@amvconsultores.com
SUPERVISOR	ING. WILSON HERNANDO PIÑARETE ORTIZ
ESTADO	EN EJECUCIÓN
VALOR	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$220.376.420,00)
ADICIÓN No.1	N/A
VALOR TOTAL ACUMULADO	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$220.376.420,00)
FECHA DE INICIO	08 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE FEBRERO DE 2025

1.4.2. Vigencia de las garantías

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - SEGUROS DEL ESTADO S.A			
POLIZA	Nº	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	11-44-101234885	08/10/2024	07/08/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e	11-44-101234885	08/10/2024	07/02/2028
Estabilidad y/o calidad de obra	11-44-101234885	08/10/2024	08/10/2029

Las pólizas se encuentran al día.

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	

1.4.3. Valor actas de cobro

A la fecha de corte del presente informe se tiene la siguiente información con respecto a las actas de cobro del contratista:

N°	Fecha	Valor acta	Estado	Observación
N/A	N/A	N/A	N/A	No se ha presentado acta de cobro durante el periodo
TOTAL	N/A	N/A	N/A	

2. ÁREA TÉCNICA

2.1. Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas.

2.1.1. Lote 1

El 5 de noviembre se emitió oficio CIV-010-2024 Sol_doc_inicia_LOTE 1, solicitando los documentos iniciales establecidos en los documentos contractuales (contrato, anexo técnico, pliegos, etc.)

Con oficio CL-B006-2024 del 7 de noviembre el lote 1 presentó soporte de hojas de vida de equipo técnico, documentación de equipos y maquinaria, APU's, programación de obra (la cual es susceptible de ajuste de acuerdo con fecha del acta de inicio), PMT para revisión, Plan de Calidad, PMA para revisión, los demás documentos y soportes exigidos contractualmente y que se ven afectados por la suscripción del acta de inicio serán enviados una vez se supere esta novedad.

Actualmente no se presenta avance en cantidades de obra debido a que no se ha suscrito la correspondiente acta de inicio, se encuentra en trámite la solicitud de suscripción de acta de inicio ante el área de contratación de la alcaldía municipal (ver numeral 1.1.2).

Se realiza recorrido con el contratista para hacer reconocimiento de los tramos de los convenios ICCU 932 y 907 e identificar novedades.



CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com

2.1.1.1. Control de Programación

No se presenta avance en el periodo evaluado debido a que no se ha suscrito acta de inicio (ver numeral 1.1.2).

2.1.1.2. Control de Equipos y maquinaria

Con respecto a este tema, a continuación, se reportan los equipos disponibles por el contratista para la ejecución de la obra y reportados mediante oficio CI-B006-2024 de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico:

Contratista	Descripción del equipo	Capacidad	Cantidad
Lote 1	Volqueta sencilla	7 M3	1
	Retroexcavadora cargadora	N/A	1
	Minicargador	N/A	1
	Vibrocompactador	6 TON	1
	Vibrador de concreto	N/A	2
	Planta eléctrica	N/A	1
	Estación y nivel para Levantamiento Topográfico	N/A	1
	Mezcladora de concreto	1 BULTO	2

Durante el periodo evaluado no se han reportado equipos ni maquinaria en obra debido a que no se han iniciado actividades en obra. No se ha suscrito acta de inicio por novedad en actualización de pólizas (ver numeral 1.1.2).

2.1.1.3. Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones

Durante el periodo evaluado no se presentan modificaciones, no se ha suscrito acta de inicio por novedad en actualización de pólizas (ver numeral 1.1.2).

2.1.1.4. Resultados de ensayos y pruebas

Durante el periodo evaluado no se presentan modificaciones, no se ha suscrito acta de inicio por novedad en actualización de pólizas (ver numeral 1.1.2).

2.1.1.5. Comentarios y Recomendaciones

Teniendo en cuenta que la principal novedad reportada por el contratista de obra está relacionada con la actualización de las pólizas, se está evaluando con la supervisión la posibilidad de evaluar una alternativa para que el contratista de obra logre proceder con las garantías.


2.1.2. Lote 2

El 5 de noviembre se emitió oficio CIV-011-2024 Sol_doc_inicia_LOTE 2, solicitando los documentos iniciales establecidos en los documentos contractuales (contrato, anexo técnico, pliegos, etc.)

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	

Durante el presente período, el contratista de obra del Lote 2 firmó acta de inicio el 02 de noviembre de 2024, este envió documentación inicial requerida por parte de la interventoría, entre las cuales se encuentran hojas de vida de personal profesional mínimo requerido, relación del equipo mínimo obligatorio, análisis de precios unitarios correspondientes a la oferta económica, oferta económica, programación de obra, plan de manejo de tránsito (PMT), plan de manejo ambiental, plan de calidad, afiliaciones y garantías firmadas, documentos los cuales fueron revisados de acuerdo al anexo técnico, se hicieron observaciones a documentos que no ponen en riesgo el inicio de las actividades en obra, y serán subsanadas por parte del contratista en los siguientes días.

Se realizó recorrido de reconocimiento en los tramos.

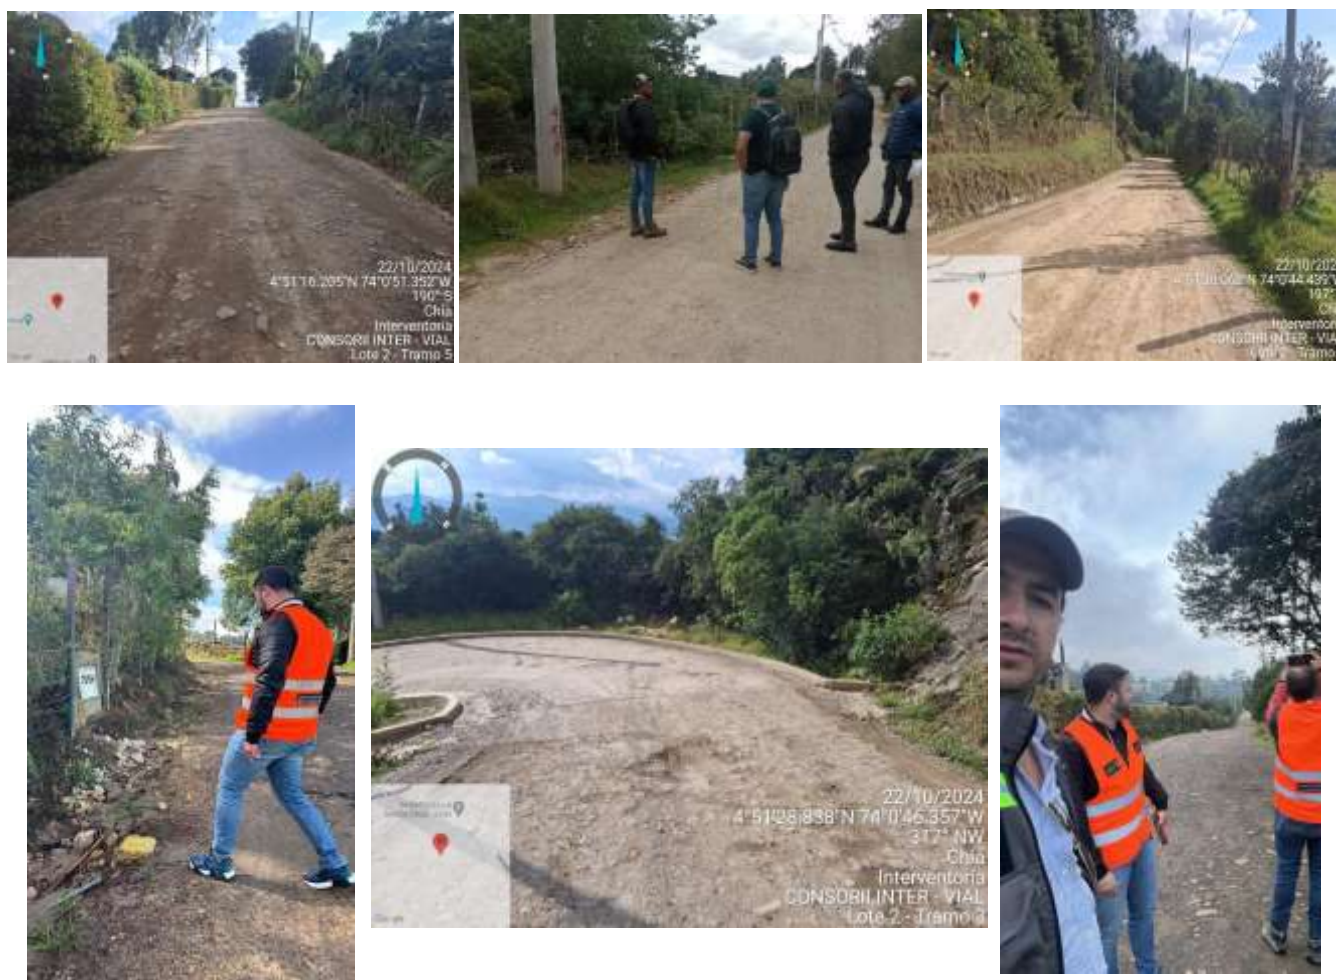


El 04 de noviembre se dio inicio a las actividades en campo correspondientes a la conformación de la calzada y la extensión del afirmado. Estas tareas fueron realizadas con el objetivo de garantizar una base adecuada para la posterior construcción de la placa huella. Con corte al 07 de noviembre, las actividades fueron ejecutadas en dos tramos principales: Sector Quebrada Honda y Sector Puente San Fermín.

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	

2.1.2.1. Control de Programación

Tramo 3 – Sector Quebrada Honda

Se trabajó en el tramo comprendido entre K0+000 y K0+180, donde se efectuaron labores de conformación de calzada, posteriormente se realizó extensión del afirmado. Se utilizó material granular de acuerdo con las especificaciones técnicas de calidad para asegurar la durabilidad de la estructura vial. Además, se realizaron pruebas de compactación en intervalos regulares para verificar que se cumplieran los estándares requeridos de densidad y resistencia.

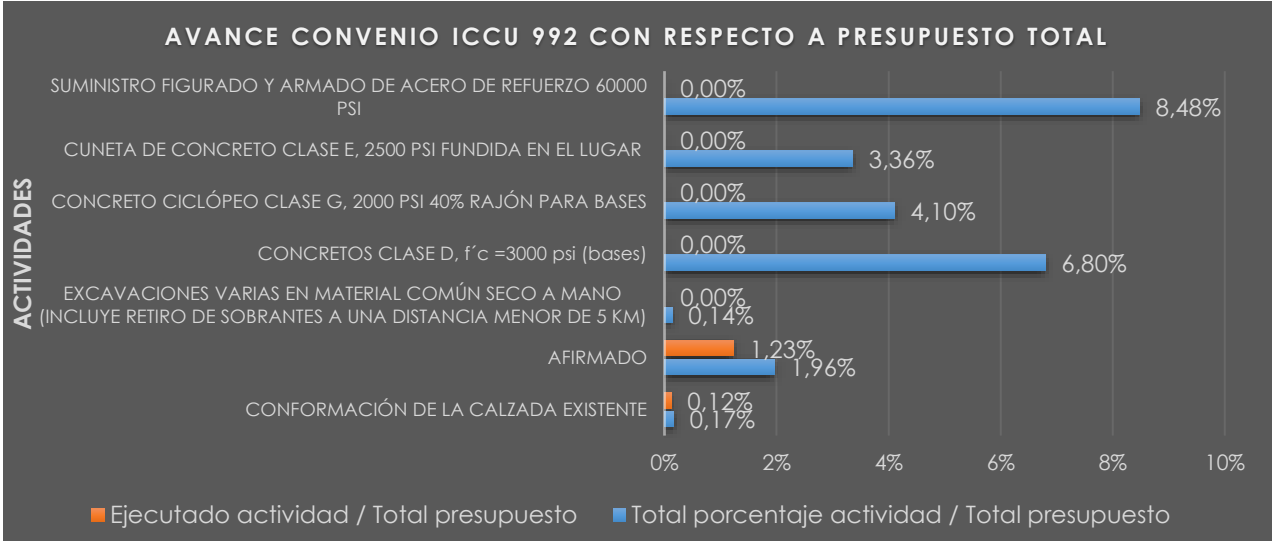


ITEM N°	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATUAL	CANTIDAD EJECUTADA AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL CONTRACTUAL	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO
CONVENIO ICCU 992											
1	310.1	INVIAS	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.213,25	300,00	\$ 1.108,00	\$ 1.441.340,00	\$ 1.063.200,00	0,17%	0,12%
2	610.1	INVIAS	AFIRMADO	M3	182,32	79,65	\$ 93.080,00	\$ 16.370.346,00	\$ 10.671.622,00	1,98%	1,23%
3	600.4P	INVIAS	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,07	-	\$ 61.340,00	\$ 1.231.094,00	\$ 0,00	0,14%	0,00%
4	630.4	INVIAS	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	74,79	-	\$ 785.487,00	\$ 58.748.573,00	\$ 0,00	6,80%	0,00%
5	630.7	INVIAS	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	68,38	-	\$ 518.521,00	\$ 35.456.466,00	\$ 0,00	4,10%	0,00%
6	671.1	INVIAS	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,22	-	\$ 642.722,00	\$ 29.063.669,00	\$ 0,00	3,36%	0,00%
7	640.1	INVIAS	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.058,21	-	\$ 10.386,00	\$ 73.285.797,00	\$ 0,00	8,48%	0,00%
SUBTOTAL								\$ 216.195.505,00	\$ 11.740.822,00	25,02%	1,36%

Tramo 4 – Sector Puente San Fermín

En el tramo comprendido entre K0+000 y K0+230, se llevaron a cabo actividades similares, conformación de calzada y la incorporación de una capa de afirmado en condiciones de humedad óptima para favorecer la compactación. El contratista empleó vibrocompactador de 4.5 toneladas para asegurar la compactación uniforme de los materiales, cumpliendo con los valores especificados en la normativa. Además, se realizaron verificaciones periódicas de la calidad del material utilizado.

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	


Ambos tramos fueron supervisados, con el fin de garantizar que los trabajos avanzaran conforme a lo planificado y con la debida resistencia estructural para soportar el tráfico vehicular proyectado.

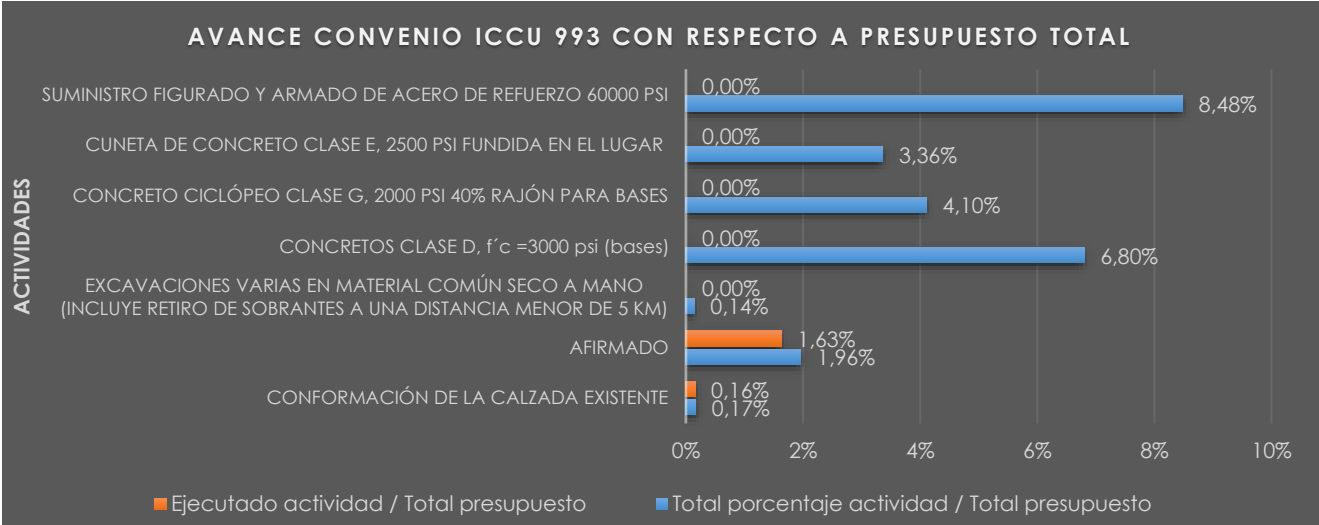

N°	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNO.	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL CONTRACTUAL	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO
	GENERAL	PARTICULAR									
CONVENIO ICCU 993											
6	370.1	INVAS	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.213,85	1.134,38	\$ 1.188,00	\$ 1.442.054,00	\$ 1.348.356,00	0,17%	0,18%
8	610.1	INVAS	AFIRMADO	M3	362,36	351,78	\$ 33.080,00	\$16.374.063,00	\$14.072.765,00	1,96%	1,63%
10	600.4 P	INVAS	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,07	-	\$ 51.340,00	\$ 1.231.034,00	\$ 0,00	0,14%	0,00%
11	630.4	INVAS	CONCRETOS CLASE D, Fc =3000 psi (bases)	M3	74,81	-	\$ 785.487,00	\$58.762.282,00	\$ 0,00	6,80%	0,00%
12	630.7	INVAS	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	68,40	-	\$ 518.521,00	\$ 35.466.836,00	\$ 0,00	4,10%	0,00%
13	671.1	INVAS	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,23	-	\$ 642.722,00	\$ 29.070.318,00	\$ 0,00	3,36%	0,00%
14	640.1	INVAS	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.057,43	-	\$ 10.386,00	\$ 73.236.468,00	\$ 0,00	8,48%	0,00%

Tramo 5 – Sector La Ye

En este tramo no se realizaron actividades en el periodo reportado

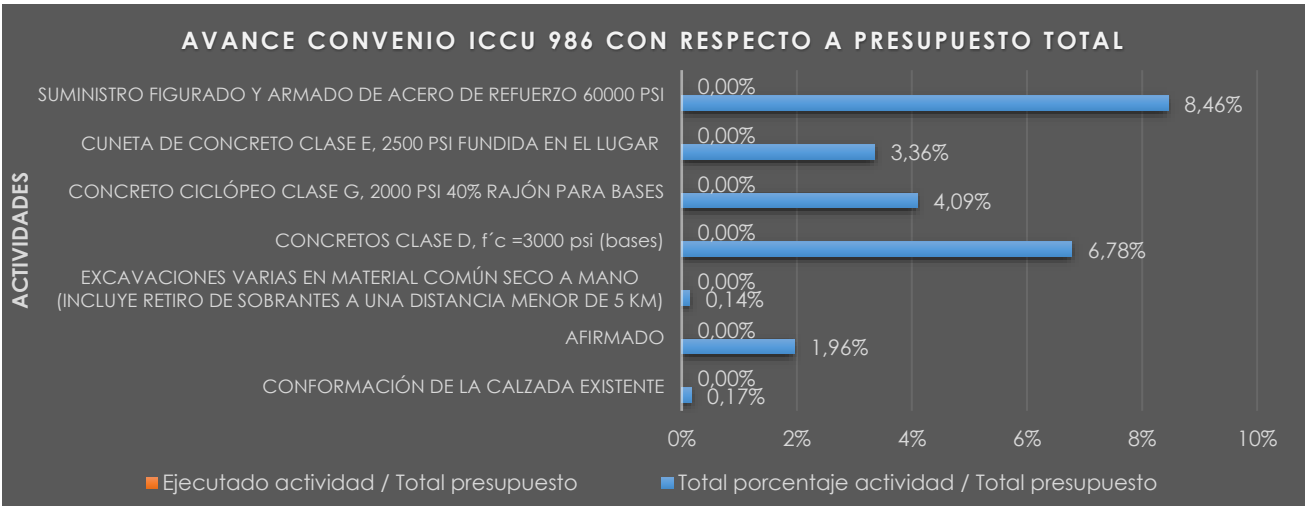


CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD CONTRATUAL	CANTIDAD EJECUTADA AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL CONTRACTUAL	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO
CONVENIO ICCU 986											
15	600.1	INVIAS	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,210.30	-	\$ 1.195,00	\$ 1.437.331,00	\$ 0,00	0,17%	0,00%
16	310.1	INVIAS	AFIRMADO	M3	101,06	-	\$ 33.000,00	\$ 3.327.529,00	\$ 0,00	1,96%	0,00%
17	610.1	INVIAS	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,02	-	\$ 61.340,00	\$ 1.228.027,00	\$ 0,00	0,14%	0,00%
18	630.4	INVIAS	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	M3	74,60	-	\$ 795.487,00	\$ 59.597.330,00	\$ 0,00	6,78%	0,00%
19	630.7	INVIAS	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	68,21	-	\$ 518.521,00	\$ 35.368.317,00	\$ 0,00	4,03%	0,00%
20	671.1	INVIAS	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,11	-	\$ 642.722,00	\$ 28.993.189,00	\$ 0,00	3,36%	0,00%
21	640.1	INVIAS	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.037,70	-	\$ 10.386,00	\$ 73.030.552,00	\$ 0,00	0,45%	0,00%
					SUBTOTAL			\$ 215.645.675,00	\$ 0,00	24,95%	0,00%

Tramo 6 – Sector El Caguán

En este tramo no se realizaron actividades en el periodo reportado

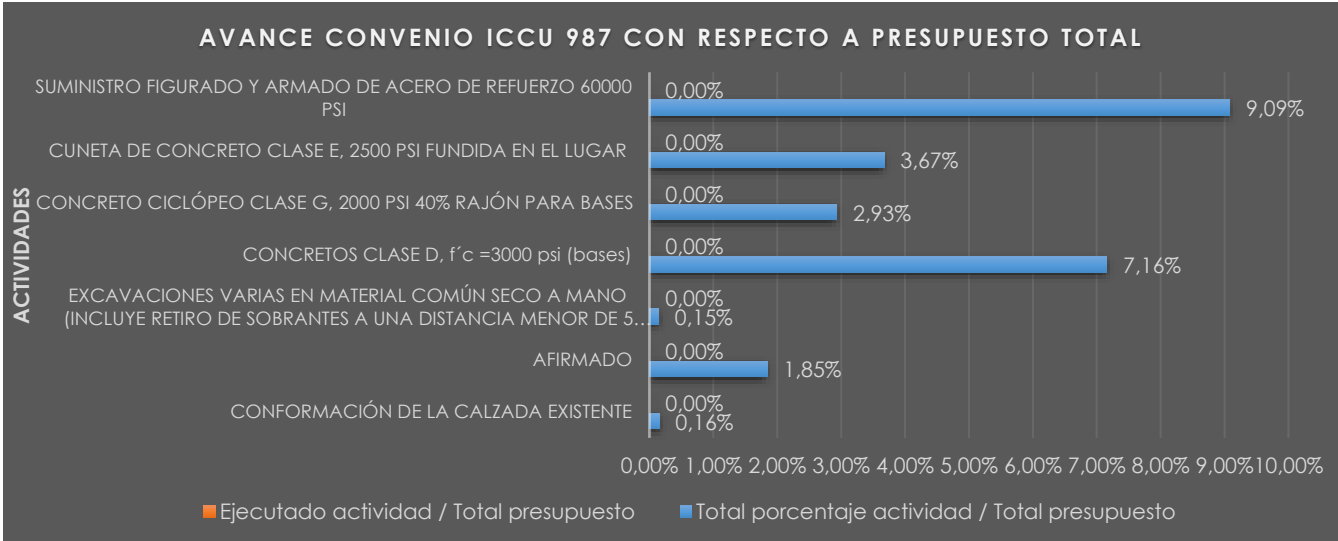

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD CONTRATUAL	CANTIDAD EJECUTADA AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL CONTRACTUAL	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO
CONVENIO ICCU 987											
15	600.1	INVIAS	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.140,40	-	\$ 1.189,00	\$ 1.354.795,00	\$ 0,00	0,16%	0,00%
16	310.1	INVIAS	AFIRMADO	M3	171,34	-	\$ 33.000,00	\$ 5.648.327,00	\$ 0,00	1,05%	0,00%
17	610.1	INVIAS	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,43	-	\$ 61.340,00	\$ 1.253.176,00	\$ 0,00	0,15%	0,00%
18	630.4	INVIAS	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	M3	78,77	-	\$ 795.487,00	\$ 61.672.871,00	\$ 0,00	7,10%	0,00%
19	630.7	INVIAS	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	48,91	-	\$ 518.521,00	\$ 25.360.862,00	\$ 0,00	2,93%	0,00%
20	671.1	INVIAS	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	49,41	-	\$ 642.722,00	\$ 31.758.894,00	\$ 0,00	3,67%	0,00%
21	640.1	INVIAS	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.958,31	-	\$ 10.386,00	\$ 78.510.994,00	\$ 0,00	3,09%	0,00%
					SUBTOTAL			\$ 216.057.059,00	\$ 0,00	25,00%	0,00%

2.1.2.2. Control de Equipos y maquinaria

Con respecto a este tema, a continuación, se reportan los equipos disponibles por el contratista para la ejecución de la obra:

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	

Contratista	Descripción del equipo	Capacidad	Cantidad
Lote 2	Flota canal MASTER 120cm ancho, con tubo extendibles		1
	Cepillo de acabado o texturizador (USA) 120cm x 3/4" 2 tubos extendibles(1,80)	N/A	1
	Planta Eléctrica HYLDG8000CL HYUNDAI 7000watt máximo, Motor Diesel 14hp Monofásica	N/A	1
	Mezcladora	2 Bultos	2
	Motor Hi Forse Gasolina 13HP E C 3600RPM	N/A	2
	Polea En Hierro 4 Doble Canal 1	N/A	2
	Motobomba Barnes Caudal AAG 15 20 HF	N/A	1
	Retroexcavadora John Deere 310J	N/A	1
	Retroexcavadora HITACHI ZX120-3	N/A	1
	Estación topográfica TOPCON GTS-236W precisión 6'' 30X	N/A	1
	Nivel automático TOPCON AT-B4A 24X	N/A	1
	Minicargador BOBCAT 863	N/A	1
	Motoniveladora DRESSER 830	N/A	1
	Vibrocompactadora INGERSOLL RAND SD40	N/A	1
	Volqueta CHEVROLET FUC525	7000 kg	1
	Volqueta CHEVROLET OTC804	7000 kg	1



2.1.2.3. Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones

Durante el periodo evaluado no se presentan modificaciones.

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	


2.1.2.4. Resumen de Ensayos y Pruebas

Al corte del presente informe, el contratista del lote 2 ha llevado a cabo ensayos y apiques para el estudio de suelos en los tramos destinados a la ejecución de los diferentes tramos de placa huella. Estas actividades geotécnicas fueron realizadas con el objetivo de obtener información detallada sobre las condiciones del terreno en las áreas específicas donde se desarrollará la obra, asegurando así que la ejecución de la placa huella se realice de acuerdo con las características del suelo, garantizando la estabilidad y seguridad del proyecto, se encuentra en revisión por la interventoría.

Durante el periodo del presente informe se hizo seguimiento a la información extraída en campo, también al seguimiento topográfico que hizo el contratista y acompañamiento con el equipo de topografía de interventoría para validar la información tomada en campo.


Se hizo levantamiento parcial de información de campo para el procesamiento en formato digital con el fin de validar los tramos a ejecutar, y de igual manera junto con el área técnica realizar verificación de cantidades de obra a través del balance general del contrato de obra del Lote 2.

Lote 2 Tramo 3 Sector Quebrada Honda.

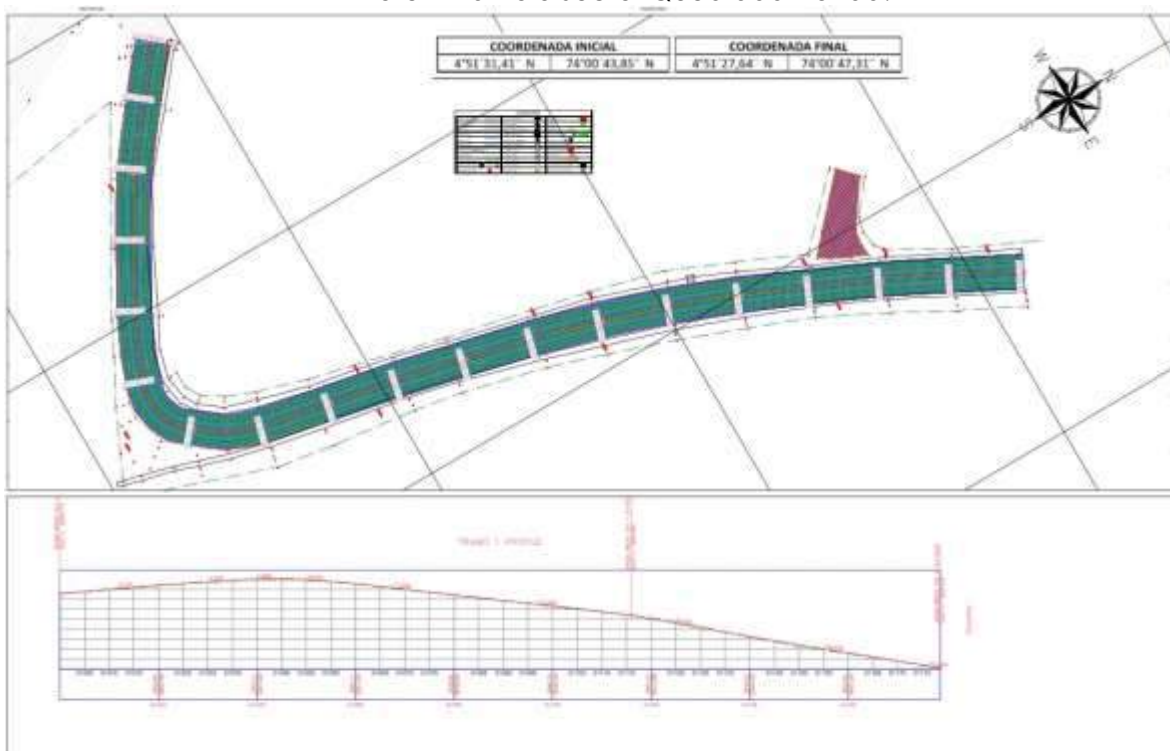


CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com

Lote 2 Tramo 4 Sector puente San Fermín

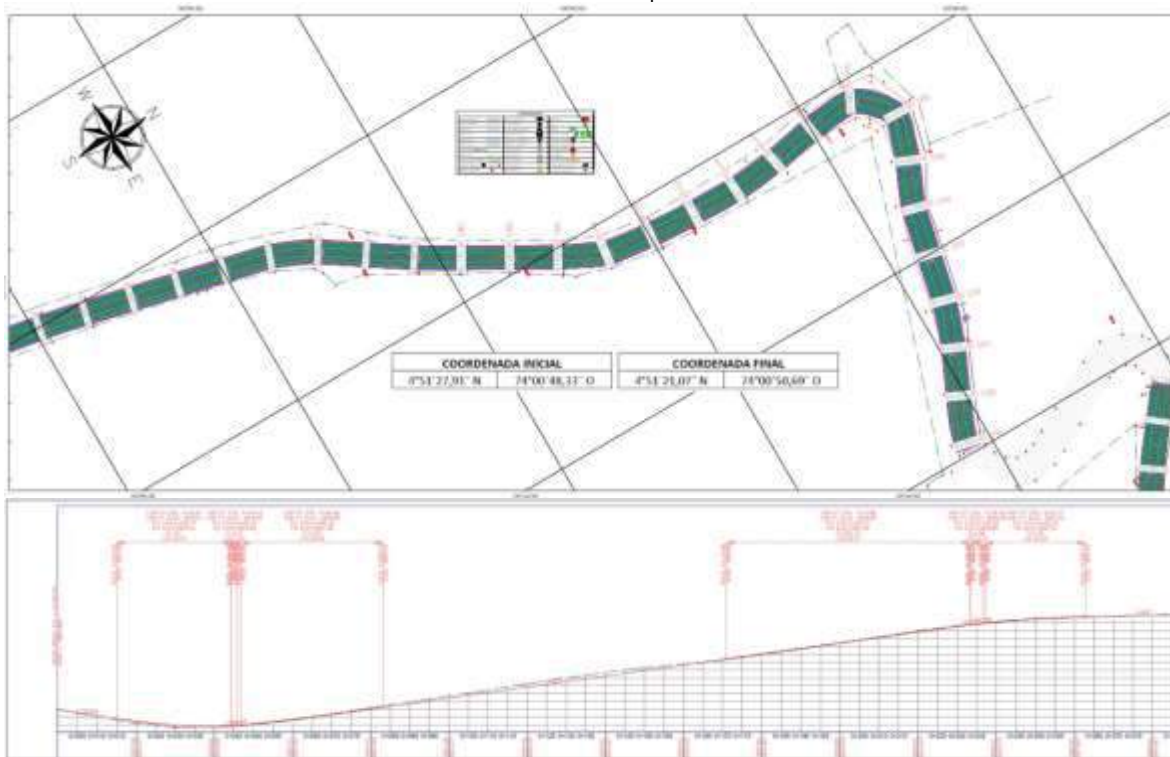

Lote 2 Tramo 5 Sector La Ye

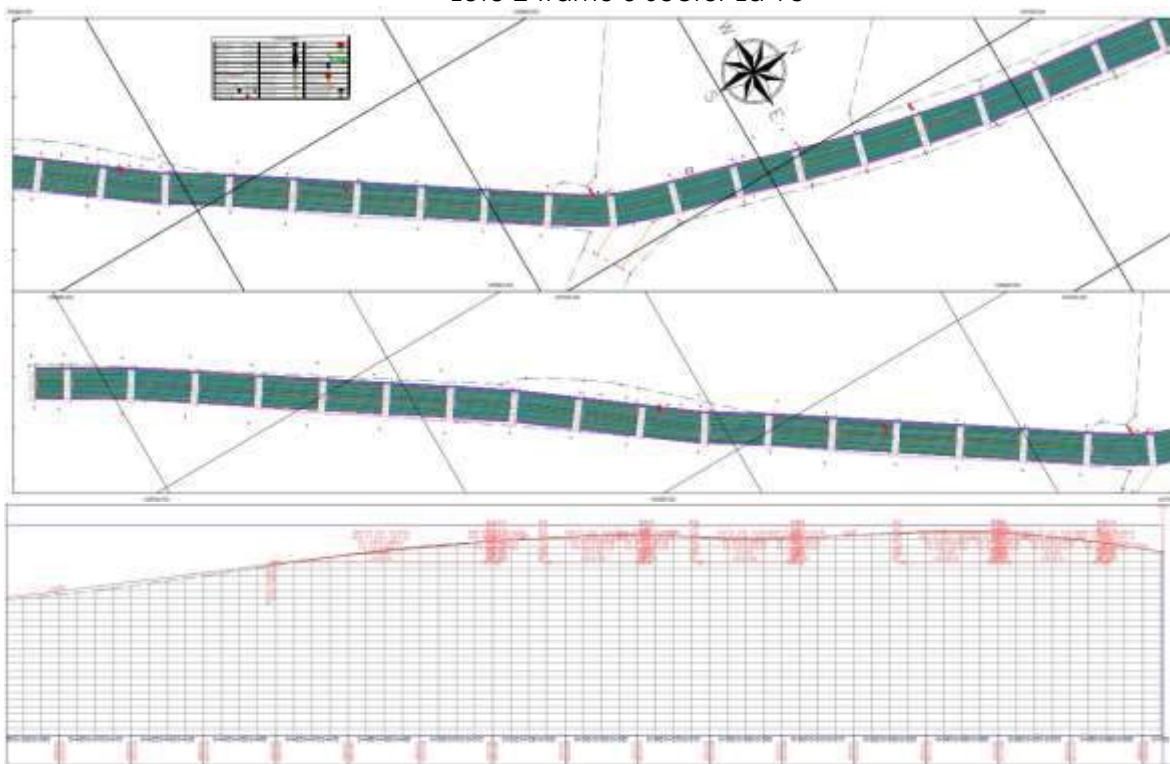

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com



Recorrido Tramo 7 – Convenio ICCU 873 de 2022



Recorrido Tramo 8 – Convenio ICCU 871 de 2022



Recorrido Tramo 9 – Convenio ICCU 975 de 2022

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	



Recorrido Tramo 10 – Convenio ICCU 872 de 2022



Recorrido Tramo 11 – Convenio ICCU 877 de 2022



Recorrido Tramo 12 – Convenio ICCU 934 de 2022

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com

2.1.3.1. Control de Programación

No se presenta avance en el periodo evaluado debido a que no se ha suscrito acta de inicio (ver numeral 1.3.2).

2.1.3.2. Control de Equipos y maquinaria

Durante el periodo evaluado no se han reportado equipos ni maquinaria debido a que no se han iniciado actividades en obra (ver numeral 1.3.2).

2.1.3.3. Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones

Durante el periodo evaluado no se presentan modificaciones.

2.1.3.4. Resumen de Ensayos y Pruebas

Durante el periodo evaluado no se realizaron ensayos ni pruebas

2.1.3.5. Comentarios y Recomendaciones

Teniendo en cuenta que la principal novedad reportada por el contratista de obra está relacionada con la actualización de las pólizas, se recomienda evaluar con el área de contratación la posibilidad de emitir el acta de inicio para que el contratista de obra logre proceder con las garantías.

3. AREA ADMINISTRATIVA

3.1. Actas de comités de obra

Durante el periodo, no se han realizado comités de obra debido a que los lotes 1 y 3 no han suscrito actas de inicio y no se han actualizado pólizas (ver numerales 1.1.2 y 1.3.2). El lote 2 inició actividades la presente semana y se tiene previsto la realización de comités de obra en terreno

3.2. Resumen del estado del contrato y subcontratos.

A continuación, se presenta el estado de cada contrato:

Contrato	Iniciado	Suspensión	Prorroga	Finalizado	Observación
Lote 1					No se ha firmado acta de inicio ni tramitado pólizas
Lote 2	 2/11/2024				Avance: 3.22% Convenios: ICCU 992 de 20022 ICCU 993 de 2022

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	

Lote 3					No se ha firmado acta de inicio ni tramitado pólizas
Interventoría	 8/10/2024				Activo en gestión de los 12 convenios ICCU. Prioridad inicio de obras

Desde antes de la formalización del acta de Inicio de los contratos 843 de 2023, 844 de 2023, y 845 de 2023, la interventoría realizó entre el 15 y 21 de octubre requerimientos de actualización de pólizas a cada uno de los contratistas de obra (CIV-001-2024, CIV-002-2024, CIV-003-2024), la correspondiente reiteración (CIV-004-2024, CIV-005-2024, CIV-006-2024) y la solicitud de documentación inicial (CIV-010-2024, CIV-011-2024, CIV-012-2024) no obstante, los lotes 1 y 3 han solicitado a la entidad la emisión del acta de inicio, lo cual se encuentra en análisis por parte del área de contratación debido a que este requerimiento no se ajusta al procedimiento llevado a cabo por la entidad.

3.2.1. Lote 1

La supervisión solicitó a la interventoría mediante oficio 051 DDI-799-2024 del 11 de octubre la necesidad de notificar a los contratistas sobre el respectivo inicio de los contratos de obra. La interventoría procedió a emitir los oficios de solicitud de actualización de pólizas (ver numeral 1.1.2), así mismo, mediante oficio CIV-010-2024 con copia a la supervisión, se solicitó al contratista de obra todos los documentos previos al inicio de actividades establecidos en los documentos contractuales. Por otra parte, el 7 de noviembre, mediante oficio CIV-014-2024 se envió al contratista de obra el listado de los ítems solicitados en los documentos contractuales (contrato, anexo técnico, pliegos, etc.) de Salud y Seguridad en el Trabajo, con el fin de que el contratista conozca las características y evidencias a inspeccionar en obra, y prepare oportunamente las respectivas evidencias de cumplimiento. En el informe del próximo periodo se reportará el avance respectivo.

Actualmente el contrato de obra no ha iniciado debido a que no se ha suscrito el acta de inicio, documento requerido por la aseguradora para la respectiva actualización de las pólizas, lo cual se mencionó en el numeral 1.1.2, no obstante, la interventoría y la supervisión están realizando las consultas correspondientes con el área de contratación para subsanar este requerimiento contractual.

Durante el presente período, la supervisión solicitó a la interventoría la revisión de los oficios enviados por el contratista de obra el pasado 3 de septiembre con número CI-B002-2024 y 2 de octubre con número CI-004-2024, debido a que el contratista manifiesta que hay entre otros, una variación de medidas de ancho de los tramos, lo cual no se ajusta con las especificaciones del ICCU, la necesidad de realizar excavación mecánica debido a los accesos de las viviendas que colindan con el tramo, aclaraciones sobre el sistema de alcantarillado y la solicitud de estudios y diseños a la alcaldía municipal. Así mismo, el contratista solicitó el análisis de la variación de precios,

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	

debido a que entre la formulación del proyecto (2023) hasta la fecha de ejecución del contrato (2024) han percibido el incremento del costo de materiales. Para esto, la interventoría previa a realizar la revisión jurídica y técnica del tema solicitó al contratista de obra la actualización de pólizas e inicio formal del contrato con el fin de actuar dentro del marco jurídico del contrato, toda vez que, en términos legales, el contrato no ha iniciado y se requiere que la alcaldía municipal cuente con todas las garantías (ver numeral 1.1.2).

3.2.2. Lote 2

La supervisión solicitó a la interventoría mediante oficio 051 DDI-799-2024 del 11 de octubre la necesidad de notificar a los contratistas sobre el respectivo inicio de los contratos de obra. La interventoría procedió a emitir los oficios de solicitud de actualización de pólizas (ver numeral 1.2.2), así mismo, mediante oficio CIV-011-2024 con copia a la supervisión, se solicitó al contratista de obra todos los documentos previos al inicio de actividades establecidos en los documentos contractuales. Por otra parte, el 7 de noviembre, mediante oficio CIV-015-2024 se envió al contratista de obra el listado de los ítems solicitados en los documentos contractuales (contrato, anexo técnico, pliegos, etc.) de Salud y Seguridad en el Trabajo, con el fin de que el contratista conozca las características y evidencias a inspeccionar en obra, y prepare oportunamente las respectivas evidencias de cumplimiento, en el informe del próximo periodo se reportará el avance respectivo.

Previo al inicio del contrato de interventoría, se llevó a cabo la socialización del proyecto de los Lotes 2 y 3, esto por solicitud de la supervisión y el ordenador del gasto, con el objetivo de informar a las partes interesadas sobre los alcances de las obras; se realizó el acompañamiento a la secretaría de Obras Públicas a la reunión de socialización con la comunidad de las veredas de Fusca y Yerbabuena, así mismo, se requirió del acompañamiento de los contratistas de obra, con el fin de explicar a la comunidad el alcance y ubicación de las obras a realizar, así como los requerimientos de cierres viales.



CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	



En general, la comunidad se presentó abierta y positiva a la construcción de las placas huella, no obstante, algunos residentes del sector de la montaña del oso manifestaron una novedad con un conflicto entre vecinos sobre un árbol que colinda con el tramo vial 5 (lote 2 – Convenio ICCU 986 de 2022). Este tema será revisado por la interventoría en el siguiente periodo.

3.2.3. Lote 3

El día 16 de octubre, la supervisión informó a la interventoría sobre el cambio de representación legal del Consorcio Vicuña delegando al señor Luis Edgar Eduardo García Santander identificado con cédula de ciudadanía N° 6763042.

Con respecto a la socialización con la comunidad, en el numeral 3.2.2 se reportó el respectivo avance.

La supervisión solicitó a la interventoría mediante oficio 051 DDI-799-2024 del 11 de octubre la necesidad de notificar a los contratistas sobre el respectivo inicio de los contratos de obra. La interventoría procedió a emitir los oficios de solicitud de actualización de pólizas (ver numeral 1.1.2), así mismo, mediante oficio CIV-012-2024 con copia a la supervisión, se solicitó al contratista de obra todos los documentos previos al inicio de actividades establecidos en los documentos contractuales. Por otra parte, el 7 de noviembre, mediante oficio CIV-016-2024 se envió al contratista de obra el listado de los ítems solicitados en los documentos contractuales (contrato, anexo técnico, pliegos, etc.) de Salud y Seguridad en el Trabajo, con el fin de que el contratista conozca las características y evidencias a inspeccionar en obra, y prepare oportunamente las respectivas evidencias de cumplimiento, en el informe del próximo periodo se reportará el avance respectivo.

No se ha dado inicio a la obra por la no suscripción del acta de inicio y la actualización de las pólizas (Ver numeral 1.3.2)

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com

3.2.4. Interventoría

El contrato se encuentra activo, con todo el equipo disponible para el inicio de actividades de los contratos de obra. Actualmente, el enfoque de la interventoría es asegurar la documentación inicial y la actualización de pólizas de los contratistas de obra, se han realizado los respectivos requerimientos formales y reiteraciones; para esto, la interventoría ha dispuesto al equipo administrativo y jurídico con el fin de acompañar a los contratistas y la supervisión.

3.3. Información sobre personal, equipos e insumos

3.3.1. Personal

En respuesta a los requerimientos anteriormente mencionados, el contratista del lote 1 remitió las hojas de vida de sus profesionales el día 7 de noviembre de 2024 a través del comunicado CI-B006-2024. El contratista responsable de lote 2 envió la documentación correspondiente a las hojas de vida. El contratista del lote 3 aún no ha enviado la documentación requerida, de esta forma se cuenta al corte del periodo reportado con el siguiente equipo de profesionales y nivel operativo:

Contratista	Cargo	Nombre	Estatus
Lote 1	Director de obra	Lina Mayerly Guarín Motta	En revisión
	Residente de obra	Juan Bernardo Cañón Parra	En revisión
	Profesional SST	Katia Margarita Almanza Barrios	En revisión
	Especialista en geotecnia	Oscar Javier Pardo Moreno	En revisión
	Profesional en trabajo social	Katherin Rocío Becerra Pinzón	En revisión
	Profesional ambiental	Nury Lisbeth Jaimes	En revisión
	Profesional en topografía	James Castro Romero	En revisión
Lote 2	Director de obra	Carlos Alberto Sánchez	Aprobado
	Residente de obra	Iván Helver Hernández	Aprobado
	Profesional SST	Yolima Ditta Quintero	Aprobado
	Especialista en geotecnia	Alain Manjarrés Correal	Aprobado
	Profesional en trabajo social	Darlis Arevalo Cotes	Aprobado
	Profesional ambiental	Jorge Mario Carrilo	Aprobado
	Profesional en topografía	Jhonis Ovidio Fragozo	Aprobado
	Profesional de apoyo	Raúl Ospino	N/A
	Obrero	Yurandir Aguilar	N/A
	Obrero	Elmer Barcinilla	N/A
	Obrero	Lannert Ceron	N/A
	Obrero	Héctor González	N/A
	Obrero	Rony González	N/A
	Obrero	Argenis Hidalgo	N/A
	Obrero	Juan Hidalgo	N/A
	Obrero	Eduardo Miranda	N/A
	Obrero	José Sierra	N/A
	Obrero	Moisés Vega	N/A
	Obrero	José Barreto	N/A
	Obrero	Edgar cruz	N/A
	Profesional de apoyo	Elber Numpaque	N/A
	Obrero	Jimmy Rodríguez	N/A
	Obrero	Luisa Fernanda Gualteros Hernández	N/A
Lote 3	Director de obra		Pendiente

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com

	Residente de obra		Pendiente
	Profesional SST		Pendiente
	Especialista en geotecnia		Pendiente
	Profesional en trabajo social		Pendiente
	Profesional ambiental		Pendiente
	Profesional en topografía		Pendiente
Interventoría	Director de interventoría	Marcos Miguel Mestra	Aprobado
	Residente de interventoría N° 1	Cesar Mosquera	Aprobado
	Residente de interventoría N° 2	Julissa Julio Argumedo	Aprobado
	Profesional SST	Leidy Andrea Beltrán	Aprobado
	Especialista en geotecnia	Víctor Hugo Daza	Aprobado
	Profesional ambiental	Katy Gómez	Aprobado
	Topógrafo	Marla Zúñiga	Aprobado

Una vez perfeccionado el acta de Inicio de la interventoría, se procedió a realizar la verificación en campo en lote 2, las coberturas de seguridad social para los trabajadores que comenzaron a realizar actividades preliminares en el proyecto, tales como estudios de suelos, topografía y recorridos, así como el uso de los elementos de protección personal adecuados para las actividades. Este proceso se llevó a cabo con el fin de asegurar que todos los trabajadores estuvieran debidamente afiliados y cubiertos ante cualquier eventualidad, incidente o accidente durante la ejecución de las tareas.

Durante el seguimiento en campo se realizaron llamados de atención verbales a los trabajadores y contratista de lote 2 sobre la importancia de cumplir con la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de sensibilizarlos sobre los riesgos presentes en las actividades realizadas, dando como resultado mejora en la cultura del autocuidado y compromiso con la seguridad y salud en el trabajo.

A lo largo de este periodo, el área SST de la interventoría garantizó el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo lo cual se evidencia con el cierre del mes en cero accidentes o incidentes y 100% de inspecciones realizadas y observaciones subsanadas.

Teniendo en cuenta que el lote 3 no ha reportado la información requerida, el 7 de noviembre de realiza un nuevo requerimiento reiterando las responsabilidades en materia de Salud y Seguridad del trabajo, se está a la espera de la correspondiente respuesta.

3.3.2. Equipos e insumos

No se reportan novedades con respecto a equipos e insumos de los lotes 1 y 3 debido a la novedad de la actualización de pólizas.

Con respecto al lote 2, el contratista de obra cuenta con el equipo de trabajo y maquinaria en los tramos de los convenios ICCU 992 y 993. Se tiene prevista la llegada de materiales de obra para la segunda semana de noviembre.

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	

4. AREA CONTABLE Y FINANCIERA

4.1. Control de presupuesto e inversión




DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL	AVANCE POR TRAMO AL 07 DE NOVIEMBRE	PORCENTAJE TOTAL CONTRACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE
CONVENIO ICCU 932 - LOTE 1 TRAMO 1 - SECTOR ANCIANATO LA MACARENA	UND	\$ 215.353.618.00	\$ 0.00	34.37%	0.00%
CONVENIO ICCU 987 - LOTE 1 TRAMO 2 - SECTOR PUEBLO FUERTE	UND	\$ 214.116.771.00	\$ 0.00	34.17%	0.00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS	UND	\$ 112.467.196.00	\$ 0.00	17.55%	0.00%
INTERVENCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	UND	\$ 94.653.896.00	\$ 0.00	13.51%	0.00%
TOTAL CONTRATO 843 - 2023		\$ 626.610.984.00	\$ 0.00	100.00%	0.00%



DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL	AVANCE POR TRAMO AL 07 DE NOVIEMBRE	PORCENTAJE TOTAL CONTRACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE
CONVENIO ICCU 992 - LOTE 2 TRAMO 3 - SECTOR QUEBRADAHONDA	UND	\$ 216.195.505.00	\$ 11.740.822.00	25.02%	1.38%
CONVENIO ICCU 993 - LOTE 2 TRAMO 4 - SECTOR PUENTE SAN FERMIN	UND	\$ 216.245.119.00	\$ 15.421.121.00	25.02%	1.79%
CONVENIO ICCU 986 - LOTE 2 TRAMO 5 - SECTOR LA Y	UND	\$ 215.645.875.00	\$ 0.00	24.95%	0.00%
CONVENIO ICCU 987 - LOTE 2 TRAMO 6 - SECTOR EL CAQUAN	UND	\$ 216.057.859.00	\$ 0.00	25.02%	0.00%
TOTAL CONTRATO 844 - 2023		\$ 864.144.358.00	\$ 27.161.943.00	100.00%	3.14%

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER 322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	

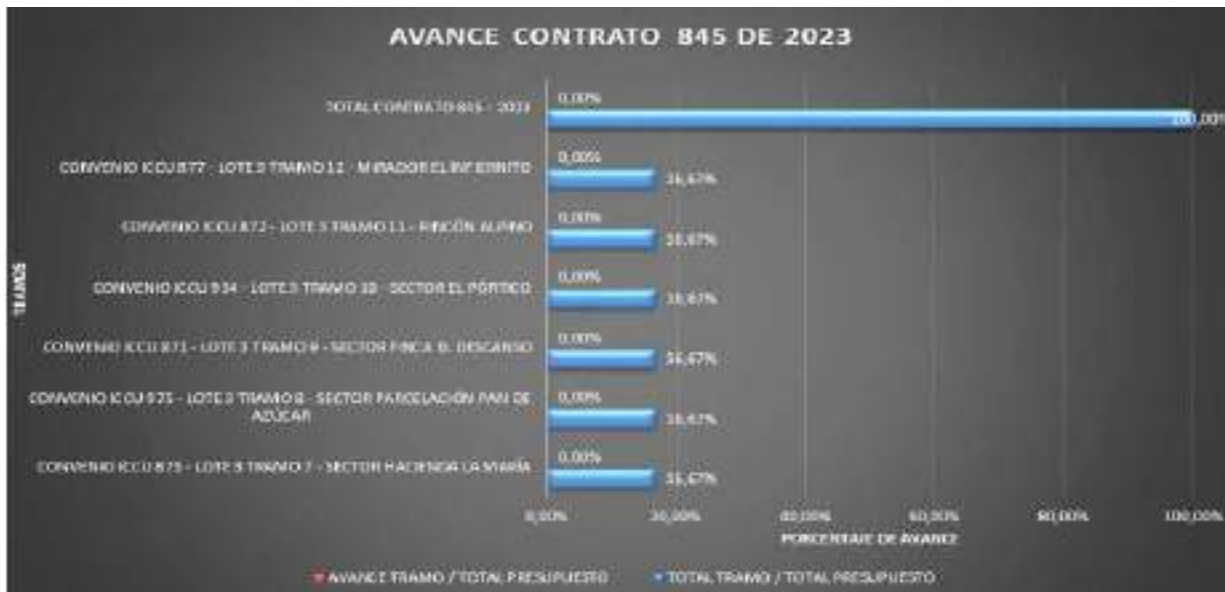

DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL	AVANCE POR TRAMO AL 07 DE NOVIEMBRE	PORCENTAJE TOTAL CONTRACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE
CONVENIO ICCU 873 - LOTE 3 TRAMO 7 - SECTOR HACIENDA LA MARÍA	UND	\$ 216.616.201,00	\$ 0,00	16,67%	0,00%
CONVENIO ICCU 975 - LOTE 3 TRAMO 8 - SECTOR PARCELACIÓN PAN DE AZÚCAR	UND	\$ 216.616.201,00	\$ 0,00	16,67%	0,00%
CONVENIO ICCU 871 - LOTE 3 TRAMO 9 - SECTOR FINCA EL DESCANSO	UND	\$ 216.616.201,00	\$ 0,00	16,67%	0,00%
CONVENIO ICCU 934 - LOTE 3 TRAMO 10 - SECTOR EL PÓRTICO	UND	\$ 216.616.201,00	\$ 0,00	16,67%	0,00%
CONVENIO ICCU 872 - LOTE 3 TRAMO 11 - RINCÓN ALPINO	UND	\$ 216.616.201,00	\$ 0,00	16,67%	0,00%
CONVENIO ICCU 877 - LOTE 3 TRAMO 12 - MIRADOR EL INFIERNO	UND	\$ 216.616.201,00	\$ 0,00	16,67%	0,00%
TOTAL CONTRATO 845 - 2023		\$ 1.299.697.206,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%

INFORMACION PRESUPUESTAL						
CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	% PROGRAMADO	DESEMBOLSADO
LOTE 1	\$626.610.584	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
LOTE 2	\$864.144.358	\$27.161.943	3,14%	\$8.641.443	1.00%	\$0
LOTE 3	\$1.299.697.206	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
INTERVENTORÍA	\$220.376.420	\$40.535.075	18,39%	\$55.094.105	25.00%	\$0
TOTAL INVERSIÓN	\$3.010.828.568	\$67.697.018	2,24%	\$63.735.548	2,11%	\$0

Cómo se ve en la anterior tabla, el valor ejecutado de \$67.7 millones es superior al programado de \$63.7 con respecto al tiempo contractual, así mismo, no se presenta desbalance para la entidad al no haberse realizado ningún pago.

4.2. Reporte de multas y sanciones


Durante el presente periodo no se han presentado multas ni sanciones en ninguno de los contratos.

4.3. Comentarios y recomendaciones

CONSORCIO INTERVIAL	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y SST para el Mejoramiento de las Vías del Municipio De Chía, Cundinamarca.	Cr 53 82 86 Of 406 ED OCEAN TOWER
Nit.901864642 – 4	Informe Mensual de Interventoría No. 1. 08/10/2024 a 07/11/2024	322 3649162-3118768740 amv@amvconsultores.com

En resumen, para el presente informe mensual, se evidencia un avance de obra limitado debido a la falta de inicio de las actividades del Lote 1 y 3 esto debido a la novedad manifestada por los 3 contratistas acerca del requerimiento de obtener el acta de inicio para la actualización de pólizas. Sin embargo, entre los aspectos más destacados se encuentran:

- **Gestión inicial y revisión documental:** Se realizaron revisiones técnicas con el inicio de las actividades en el Lote 2, tales como conformación de la calzada y extendido de afirmado, además de esto, teniendo en cuenta que a la fecha de finalización del periodo los contratistas del lote 1 y 3 no han allegado pólizas conforme a requerido, resulta necesario realizar seguimiento constante desde la interventoría para la consecución de las mismas a través de envío de comunicados y reunión con las partes, con el fin de que se subsane dicho requerimiento.
- **Acciones de interventoría:** Se avanzó en la socialización del proyecto con las comunidades para los lotes 1 y 2, el análisis preliminar de las condiciones técnicas de los tramos a intervenir, y el seguimiento a la preparación de los contratistas para iniciar las actividades, incluyendo estudios topográficos.



Juan David Aldana Colmenares
Representante Legal
Consortio Intervial
NIT: 901.864.642-4

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

CONSORCIO INTER-VIAL, identificado con NIT 901.864.642-4, integrado por MSC INGENIERIA S.A.S, representado legalmente por Diego Alejandro Leiva Ortiz identificado con cédula de Ciudadanía No. 91.523.365, y AMV CONSULTORES S.A.S, representado legalmente por Juan David Aldana Colmenares identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.072.655.823, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía en el periodo del 08 de diciembre de 2024 al 07 de enero de 2025.


Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los siete (7) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,



DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ
Representante Legal
MSC INGENIERIA S.A.S



JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
Representante Legal
AMV CONSULTORES S.A.S



RIGOBERTO PARRA MORENO
Contador Público
CONSORCIO INTER-VIAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

E786D0B944C181B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RIGOBERTO PARRA MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79064808 de LA MESA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 272221-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 13 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 79.064.808

PARRA MORENO

APellidos

RIGOBERTO

Nombre



FECHA DE NACIMIENTO 12-DIC-1977

LA MESA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71
ESTATURA

O+
GRUPO SANG.

M
SEXO

10-MAR-1997 LA MESA
FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN

NOTA: VERIFICAR

REGISTRADOR NACIONAL
CALLE 400, SANTO DOMINGO



REPÚBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE INTERIORES

BOGOTÁ - D.C.

1997-03-10

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



272221-T

**RIGOBERTO
PARRA MOFENO
C.C. 79064818**

**RES. INSCRIPCION 1034 DEL 10/07/2020
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN**



292864

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

306096





UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL
**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



CIDMA

[illegible]

10-Minute Summary													
Category / LPI	Item/Service	QTY	Customer/Manager	LPI/Activity	Involvement		Learning/Workload		Time/Week	Total/Week	Days/Week (LPI)	Total # Pages	No. Activities
					No. Activities	Value	No. Workbooks	Hours					
077002	Initial Value LPI	001-0007-4	271,000	0	0	0	0	0	0	0	0	271,000	0
077000	Service LPI	0001-00-0	134,700	0	0	0	0	0	0	0	0	134,700	0
078000	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078001	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078002	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078003	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078004	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078005	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078006	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078007	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078008	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078009	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078010	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078011	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078012	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078013	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078014	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078015	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078016	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078017	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078018	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078019	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078020	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078021	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078022	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078023	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078024	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078025	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078026	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078027	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078028	Other LPI	000000-00-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078029	Other LPI	000000-00-0	0	0	0</								

[illegible][illegible]

TOTAL (20 + 2A + 2B)							
College ID#	Section	CR	Non-Credit	Drop Rate	Drop Rate Count	Total # Pages	No. Missing
0022	General	90007128	128.00	1	00	128.00	0

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

Hoja 1 de 1

DATOS DEL EMPLEADO						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE EMPLEADO	EMPRESA	TELÉFONO	CORREO	VERIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES Y SALUD
01	8013456789	JOSE CARLOS PÉREZ GARCÍA	EMPRESA DE SERVICIOS Y ASISTENCIA A CLIENTES	011-12345678	carlos.perez@compensar.com	
TIPO DE APORTA	CLASE APORTA	FORMA APORTA	PERÍODO APORTA	CLASE APORTA		VERIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES Y SALUD
01	01	01	01	01		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA APORTA	PLANILLA APORTA	PLANILLA APORTA	PLANILLA APORTA	PLANILLA APORTA	PLANILLA APORTA
01	01	01	01	01	01
01	01	01	01	01	01
01	01	01	01	01	01
01	01	01	01	01	01

DETALLE DE APORTAS				
PLANILLA APORTA	PLANILLA APORTA	PLANILLA APORTA	PLANILLA APORTA	PLANILLA APORTA
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01

DETALLE DE APORTAS			
PLANILLA APORTA	PLANILLA APORTA	PLANILLA APORTA	PLANILLA APORTA
01	01	01	01
01	01	01	01
01	01	01	01
01	01	01	01
01	01	01	01
01	01	01	01
01	01	01	01
01	01	01	01
01	01	01	01
01	01	01	01

PAGADA

DAFTAR DOKUMEN					
No. Dokumen	Nama Dokumen	Tipe Dokumen	Tgl. Penerimaan	Status Dokumen	
				Disetujui	Salah
1	Survei Peta	Survei Peta	2010	Disetujui	Salah
2	Survei Peta	Survei Peta	2011	Disetujui	Salah
3	Survei Peta	Survei Peta	2012	Disetujui	Salah
4	Survei Peta	Survei Peta	2013	Disetujui	Salah
5	Survei Peta	Survei Peta	2014	Disetujui	Salah
6	Survei Peta	Survei Peta	2015	Disetujui	Salah
7	Survei Peta	Survei Peta	2016	Disetujui	Salah
8	Survei Peta	Survei Peta	2017	Disetujui	Salah
9	Survei Peta	Survei Peta	2018	Disetujui	Salah
10	Survei Peta	Survei Peta	2019	Disetujui	Salah
11	Survei Peta	Survei Peta	2020	Disetujui	Salah
12	Survei Peta	Survei Peta	2021	Disetujui	Salah
13	Survei Peta	Survei Peta	2022	Disetujui	Salah
14	Survei Peta	Survei Peta	2023	Disetujui	Salah
15	Survei Peta	Survei Peta	2024	Disetujui	Salah
16	Survei Peta	Survei Peta	2025	Disetujui	Salah
17	Survei Peta	Survei Peta	2026	Disetujui	Salah
18	Survei Peta	Survei Peta	2027	Disetujui	Salah
19	Survei Peta	Survei Peta	2028	Disetujui	Salah
20	Survei Peta	Survei Peta	2029	Disetujui	Salah
21	Survei Peta	Survei Peta	2030	Disetujui	Salah
22	Survei Peta	Survei Peta	2031	Disetujui	Salah
23	Survei Peta	Survei Peta	2032	Disetujui	Salah
24	Survei Peta	Survei Peta	2033	Disetujui	Salah
25	Survei Peta	Survei Peta	2034	Disetujui	Salah
26	Survei Peta	Survei Peta	2035	Disetujui	Salah
27	Survei Peta	Survei Peta	2036	Disetujui	Salah
28	Survei Peta	Survei Peta	2037	Disetujui	Salah
29	Survei Peta	Survei Peta	2038	Disetujui	Salah
30	Survei Peta	Survei Peta	2039	Disetujui	Salah
31	Survei Peta	Survei Peta	2040	Disetujui	Salah
32	Survei Peta	Survei Peta	2041	Disetujui	Salah
33	Survei Peta	Survei Peta	2042	Disetujui	Salah
34	Survei Peta	Survei Peta	2043	Disetujui	Salah
35	Survei Peta	Survei Peta	2044	Disetujui	Salah
36	Survei Peta	Survei Peta	2045	Disetujui	Salah
37	Survei Peta	Survei Peta	2046	Disetujui	Salah
38	Survei Peta	Survei Peta	2047	Disetujui	Salah
39	Survei Peta	Survei Peta	2048	Disetujui	Salah
40	Survei Peta	Survei Peta	2049	Disetujui	Salah
41	Survei Peta	Survei Peta	2050	Disetujui	Salah
42	Survei Peta	Survei Peta	2051	Disetujui	Salah
43	Survei Peta	Survei Peta	2052	Disetujui	Salah
44	Survei Peta	Survei Peta	2053	Disetujui	Salah
45	Survei Peta	Survei Peta	2054	Disetujui	Salah
46	Survei Peta	Survei Peta	2055	Disetujui	Salah
47	Survei Peta	Survei Peta	2056	Disetujui	Salah
48	Survei Peta	Survei Peta	2057	Disetujui	Salah
49	Survei Peta	Survei Peta	2058	Disetujui	Salah
50	Survei Peta	Survei Peta	2059	Disetujui	Salah
51	Survei Peta	Survei Peta	2060	Disetujui	Salah
52	Survei Peta	Survei Peta	2061	Disetujui	Salah
53	Survei Peta	Survei Peta	2062	Disetujui	Salah
54	Survei Peta	Survei Peta	2063	Disetujui	Salah
55	Survei Peta	Survei Peta	2064	Disetujui	Salah
56	Survei Peta	Survei Peta	2065	Disetujui	Salah
57	Survei Peta	Survei Peta	2066	Disetujui	Salah
58	Survei Peta	Survei Peta	2067	Disetujui	Salah
59	Survei Peta	Survei Peta	2068	Disetujui	Salah
60	Survei Peta	Survei Peta	2069	Disetujui	Salah
61	Survei Peta	Survei Peta	2070	Disetujui	Salah
62	Survei Peta	Survei Peta	2071	Disetujui	Salah
63	Survei Peta	Survei Peta	2072	Disetujui	Salah
64	Survei Peta	Survei Peta	2073	Disetujui	Salah
65	Survei Peta	Survei Peta	2074	Disetujui	Salah
66	Survei Peta	Survei Peta	2075	Disetujui	Salah
67	Survei Peta	Survei Peta	2076	Disetujui	Salah

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

Página 1 de 1

DATOS DE APORTANTE						
NOMBRE	IDENTIFICACION	FECHA DE APORTA	CI	TELEFONO	UBICACION	INDICADOR PASO
IN	30-0000-7-6	480-00000-0000-000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	00
Forma de Aportación	CLASE DE APORTA	VALOR DE APORTA	CI	UBICACION	INDICADOR PASO	INDICADOR PASO
000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	00

DATOS DE LA PLANILLA					
FECHA DE APORTA	FECHA DE APORTA	FECHA DE APORTA	FECHA DE APORTA	FECHA DE APORTA	FECHA DE APORTA
000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES POR SUBSISTEMAS											
Código	Subsistema	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000

TOTALES POR SUBSISTEMAS											
Código	Subsistema	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000

TOTALES POR SUBSISTEMAS											
Código	Subsistema	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000

TOTALES POR SUBSISTEMAS											
Código	Subsistema	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago	CI	Indicador de Pago
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000

TOTALES POR SUBSISTEMAS				
Código	Subsistema	CI	Indicador de Pago	CI
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000

TOTALES POR SUBSISTEMAS				
Código	Subsistema	CI	Indicador de Pago	CI
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000



They are:

DECLARATION OF IMPORTATION									
DATE	IMPORTER	IMPORTER'S ADDRESS	IMPORTER'S PHONE	IMPORTER'S FAX	IMPORTER'S E-MAIL	IMPORTER'S SIGNATURE	IMPORTER'S NAME	IMPORTER'S ADDRESS	IMPORTER'S PHONE
01/01/2011	ABC COMPANY	123 STREET, NEW YORK, NY 10001	(212) 555-1234	(212) 555-5678	abc@company.com	[Signature]	JOHN DOE	123 STREET, NEW YORK, NY 10001	(212) 555-1234

DECLARATION OF EXPORTATION									
DATE	EXPORTER	EXPORTER'S ADDRESS	EXPORTER'S PHONE	EXPORTER'S FAX	EXPORTER'S E-MAIL	EXPORTER'S SIGNATURE	EXPORTER'S NAME	EXPORTER'S ADDRESS	EXPORTER'S PHONE
01/01/2011	XYZ COMPANY	456 STREET, NEW YORK, NY 10001	(212) 555-4567	(212) 555-8901	xyz@company.com	[Signature]	JANE SMITH	456 STREET, NEW YORK, NY 10001	(212) 555-4567

[illegible]

CONSORCIO INTERVIAL
NIT 901 864 642-4
CR 53 #3 89 OF 406 ED OCEAN TOWER
Tel (605) 3112764740
Barranquilla - Colombia
i@consorciointervial.com

No. CIV 1

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA			Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
NIT	999 999 172-8	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000		
Dirección	CL 11 9-2	Ciudad	Chia - Colombia	2025-01-24	2025-01-30

Item	Descripción	Vl. Unitario	Impcto. Cargo	Valor Impcto.Cargo	Vl. Total
1	Contrato de intervención C01 POCNTR 6442037 Acta No 1 correspondiente al periodo del 08 de octubre al 07 de noviembre del 2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA.	34,363,066.84	19 %	6,471,986.59	40,835,073.72

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta millones quinientos treinta y cinco mil setenta y cinco pesos m/cde con setenta y dos cent.

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuenta No. 881 vence el 2025-01-30 por

\$ 40,835,073.72

Total Bruto	34,363,066.84
IVA 19%	6,471,986.59
Total a Pagar	40,835,073.72

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CAJA SOCIAL No 24138321273 A NOMBRE DEL
CONSORCIO INTER - VIAL CON NIT 901 864 642-4.

Este es un proveedor de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141120028485



5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección nacional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 6 4 6 4 2 4

2

Características y formas de las organizaciones

82. Naturaleza

2

83. Formas asociativas

85. Fondos

86. Cooperativas

88. Sin personería jurídica

3

89. Otras organizaciones no clasificadas

94. Entidades o miembros del servicio público de orden nacional, departamental, municipal y distrital/locales

97. Sociedad y organización extranjera

M. Beneficiario

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 4 0 5 0 3

74. Número de registro

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

80. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional pública

0 0 %

84. Nacional privada

1 0 0 0 %

86. Extranjero

0 %

89. Extranjero público

0 0 %

87. Extranjero privado

0 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 2 4 0 5 0 3

81. Hasta

2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item

89. Estado actual

90. Fecha cambio de estado

91. Número de identificación Tributaria (NIT)

92. DV

1

8 0

2 0 2 4 0 8 2 8

2

3

4

5

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación Tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación Tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141120028485



5. Número de identificación Tributaria (NIT)

8. DV

12. Dirección electoral

14. Jurisdicción electoral

9 0 1 8 5 4 6 4 2

4

Regiones de Beneficiarios

2

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 4 0 5 0 3

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 1 3

101. Número de identificación

8 1 5 2 3 3 6 5

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

LEIVA

105. Segundo apellido

ORTIZ

106. Primer nombre

DIEGO

107. Otros nombres

ALEJANDRO

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 4 0 5 0 3

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 1 3

101. Número de identificación

1 0 7 2 6 5 5 8 2 3

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

ALDANA

105. Segundo apellido

COLMENARES

106. Primer nombre

JUAN

107. Otros nombres

DAVID

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 1 3

101. Número de identificación

1 1 2 0 4 9 0 5

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

VERGARA

105. Segundo apellido

ALDANA

106. Primer nombre

DIEGO

107. Otros nombres

FERNANDO

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141120028485



141120028485

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección sectorial

14. Fuente electrónica

9 0 1 8 6 4 6 4 2 4

4

Ingresos de Beneficencia

2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NT	3 1 8 3 0 0 9 0 2 8 5	8	COLOMBIA

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
MSC INGENIERIA S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 0 5 0 3	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NT	3 1 9 0 1 2 4 5 6 1 7	4	COLOMBIA

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
AMV CONSULTORES SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 0 5 0 3	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO INTER-VIAL ✓

Identificado con NI 9018646424 ✓

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina ALTO PRADO,
con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24138321273
Fecha de apertura:	30 de Agosto de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0632
ALTO PRADO de la ciudad de BARRANQUILLA, el día Viernes, 30 de Agosto de 2024. ✓

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva
