

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.7457659		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA PAVIMENTOS Y GEOTECNIA PARA LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA EL MUNICIPIO DE CHIA BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.		
Contratista:	CARLOS ANDRES MANRIQUE CASTRO		
No. de Cedula	12.278.322		
Fecha Inicio del Contrato	14-Febr-2025	Fecha de Terminación	13-Ago-2025
Periodo del Informe	14 de Mayo al 13 de Junio 2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 53.298.000.00
Valor a Pagar en este periodo	\$8.883.000.00
Saldo por Pagar	\$17.766.000.0
Pago No.	4

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
ALCALDIA DE CHIA	\$8.883.000	14-02-2025 / 13-08-2025

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	86674707	Mayo	\$ 444.200
Pensión			\$ 568.600
ARL			\$ 18.600
TOTAL			\$ 1.031.400

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR. 7457659 me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 14/05/2025 A 13/06/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

1. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Apoyar la elaboración de conceptos técnicos especializados en el área de pavimentos de vías y/o geotecnia, requeridos en los proyectos de infraestructura que adelante la secretaria de Obras Públicas.

2. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Realizar visitas de inspección a los frentes de trabajo que este adelantando la secretaria de Obras Públicas, con el fin de emitir conceptos técnicos en relación al estado de las vías del Municipio de Chía.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTAS DOS OBLIGACIONES

Visitas de obra y conceptos técnicos en relación al estado de las vías:
Vías en pavimento asfáltico. Se realiza visita de campo a las vías a intervenir durante este periodo, visita de tipo técnico, realizando recorrido y determinando los diferentes daños presentes en el pavimento y su respectiva intervención encontrando los siguientes daños: piel de cocodrilo, baches, hundimientos y fisuramientos. Para su mantenimiento se utilizará mezcla densa en caliente. Se realiza corte, limpieza y retiro de material fatigado, suministro e instalación de MDC-19

Equipo: Cortadora, Volquetas, reto cargador vibro compactador y herramienta menor.

1.1 Vereda Yerbabuena Vía Colegio la Inmaculada (Sector Sindamanoy)



Vías pavimento en frio: Se realiza visita de campo a las vías a intervenir durante este periodo, visita de tipo técnico, realizando recorrido y determinando los diferentes daños presentes en el pavimento y su respectiva intervención encontrando los siguientes daños: baches, hundimientos y fisuramientos. Para su mantenimiento se utilizará material granular (b-400, fresado o material reciclado) y/o asfaltita natural y emulsión asfáltica. Se realiza el mantenimiento de la estructura corte, limpieza y retiro de material fatigado, suministro e instalación del material.

Equipo: Cortadora, Volquetas, reto cargador vibro compactador, motoniveladora y herramienta menor.

1.2 Camino Santa Barbara entre la Glorieta vía Chía-Cota (Sector Casa de la mujer) y Camino a la Lucerna - Vereda Fonqueta



1.3 Camino El Cerro entre Caminos el Eden y Los Lavaderos (sector Kalamary) - Vereda Cerca de Piedra

ANTES



DURANTE



DESPUES



1.4 Camino a La lucerna entre camino santa barbara y Jardin Infantil colsubsidio

ANTES



DURANTE



DESPUES



1.5 Vía Resguardo Indígena

ANTES



DURANTE



DESPUES



1.6 Calle 26 (camino la Floresta) entre carreras 9 y 2 Este

ANTES

DURANTE

DESPUES



1.7 Vereda Fagua Sector San Miguel

ANTES

DURANTE

DESPUES



1.8 Carrera 11 entre Caminos Puente Peralta y Costa Rica


ANTES

DURANTE

DESPUES



1.9 Calle 29 entre Carreras 2 Este y 9

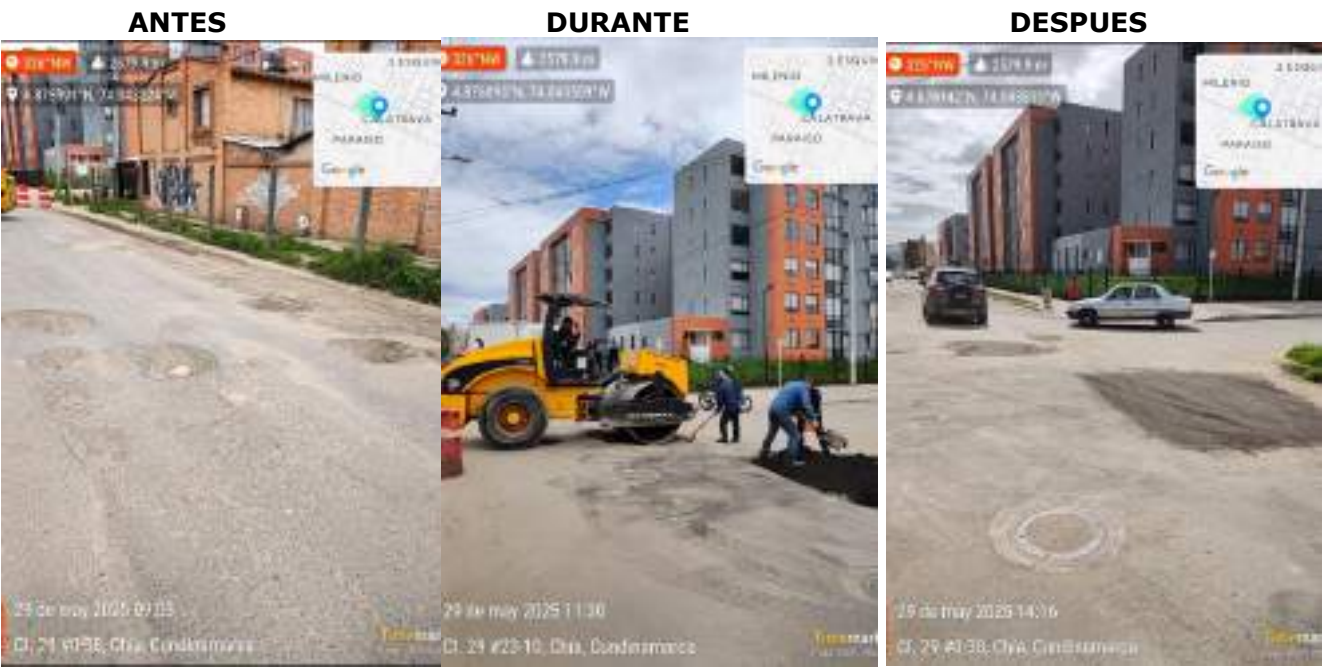

1.10 Carrera 11 entre Calle 25 y Camino Guanata



1.11 Sector punto de Encuentro - Vereda Tiquiza sector Cuatro Esquinas



1.12 Via Colegio de Fagua entre Caminos Guanata y La Leonor



1.13 Carrera 11 entre Caminos Guanata y Costa Rica



1.14 Carrera 11 entre Calle 29 y camino Guanata



1.15 Carrera 11 entre Calle 29 y camino Guanata



1.16 Camino El Cerro entre Caminos de Alejandria y El Volador



1.17 Calle 11 La Union entre Avenida Chilacos y Vía a la Lucerna



1.18 Camino El cerro entre Camino La Leonor y Vía a Tabio



1.19 Camino El Volador entre Vía a la Lucerna y camino El Cerro



1.20 Camino El Cerro entre Polideportivo Tiquiza y Camino de Alejandria




1.21 Camino El Cerro entre Caminos las Eses y La Leonor



Vías pavimento en frio: Una vez se realiza el mantenimiento y/o recuperación de la estructura de la vía, se aplicará el sello Slurry

Equipo: Camión Slurry y herramienta menor.

1.22 Camino El Chorro entre Cuatro Esquinas y camino Alejandria

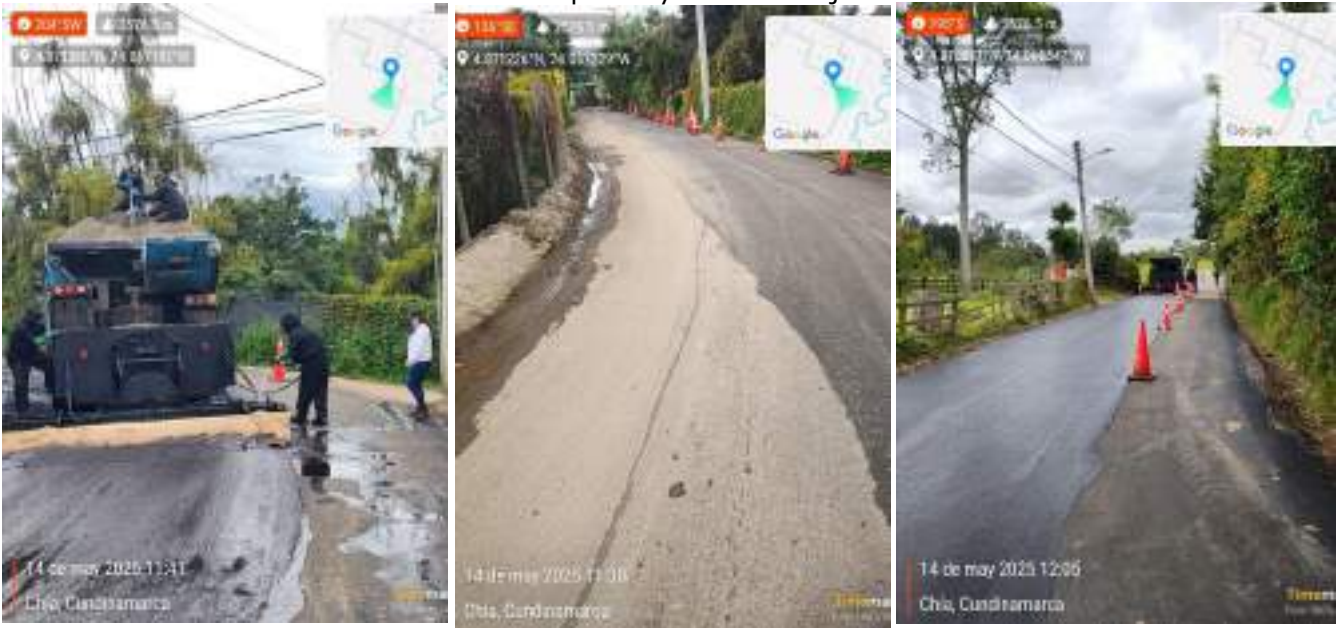


1.23 Via Tabio (CALLE 19) entre sector Cuatro Esquinas y Rio Frio



1.24 Camino Santa Barbara entre la Glorieta vía Chía-Cota (Sector Casa de la mujer) y Camino a la Lucerna - Vereda Fonqueta



1.25 Vía a la Lucerna entre los caminos a Tenjo y Camino Santa Barbara (Vereda Fonqueta

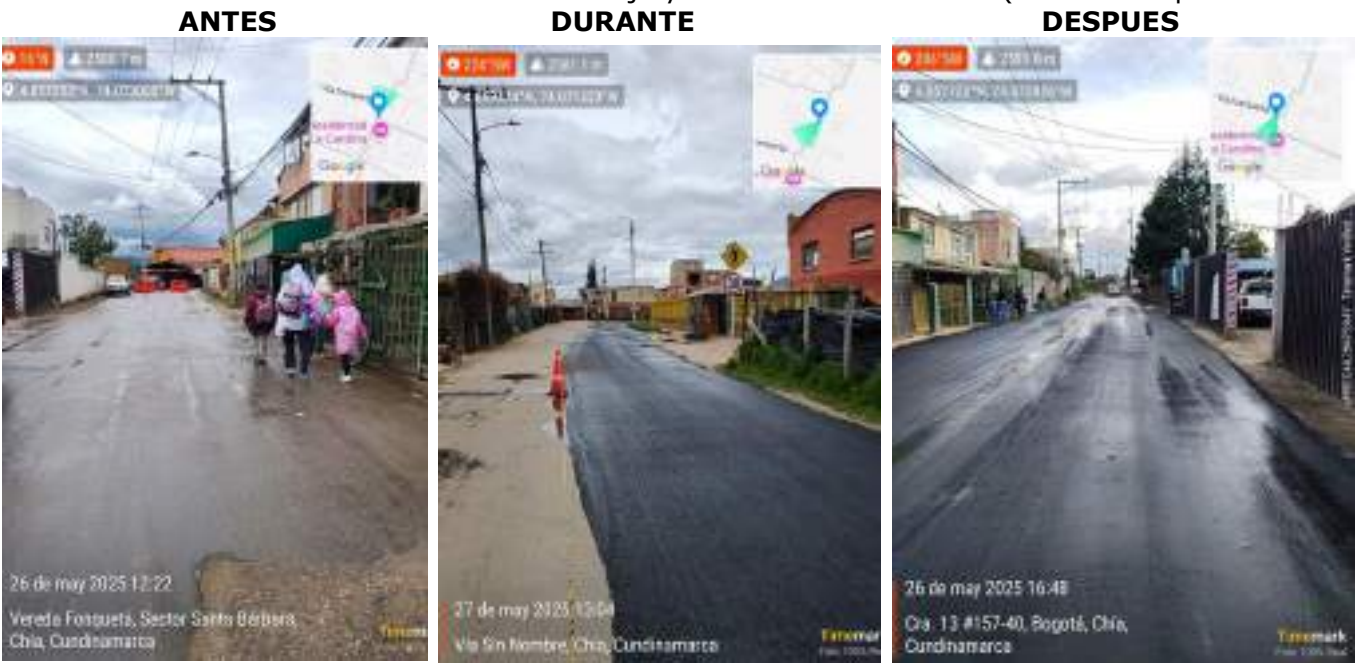


1.26 Camino a la Lucerna entre camino Santa Barbara y Jardin Infantil Colsubsidio (Vereda Fonqueta)



1.27 Camino El Cerro entre Caminos el Eden y Los Lavaderos (sector Kalamary) - Vereda Cerca de Piedra




1.28 Vía Colegio de Fagua entre Caminos Guanata y La Leonor

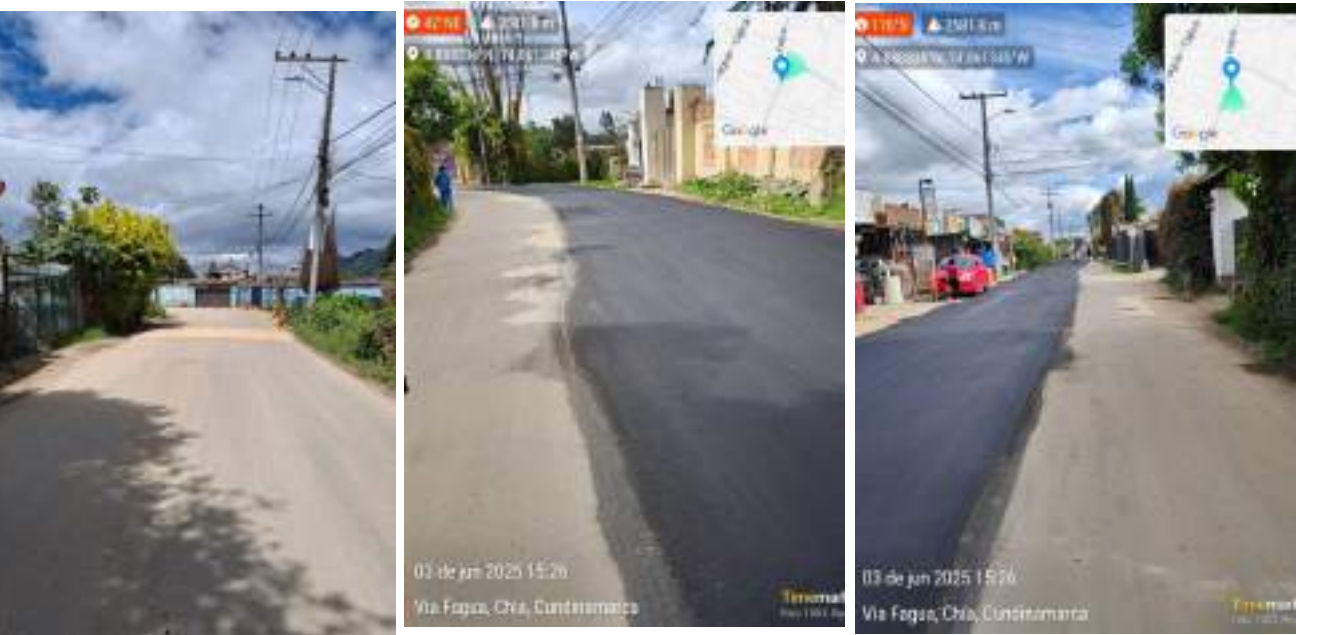

1.29 Camino El Cerro entre Caminos de Alejandria y El Volador




1.30 Calle 11 La Union entre Avenida Chilacos y Vía a la Lucerna

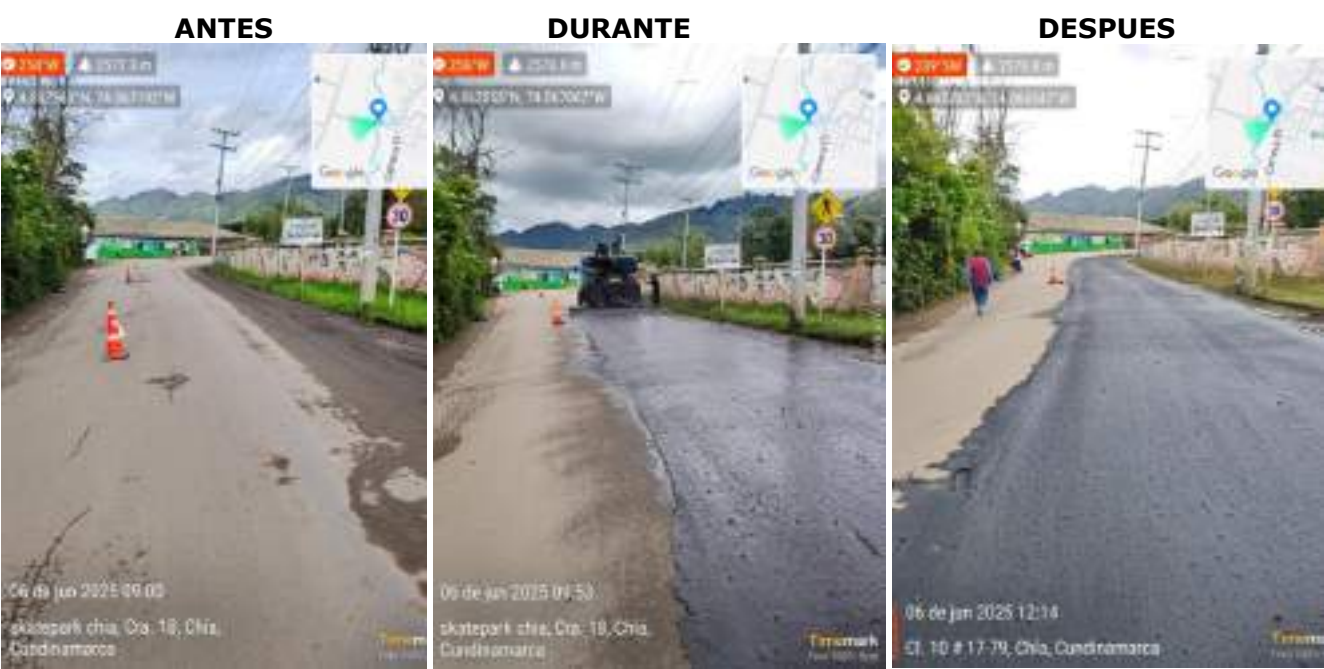

1.31 Camino El Volador entre Vía a la Lucerna y camino El Cerro

ANTES	DURANTE	DESPUES
-------	---------	---------

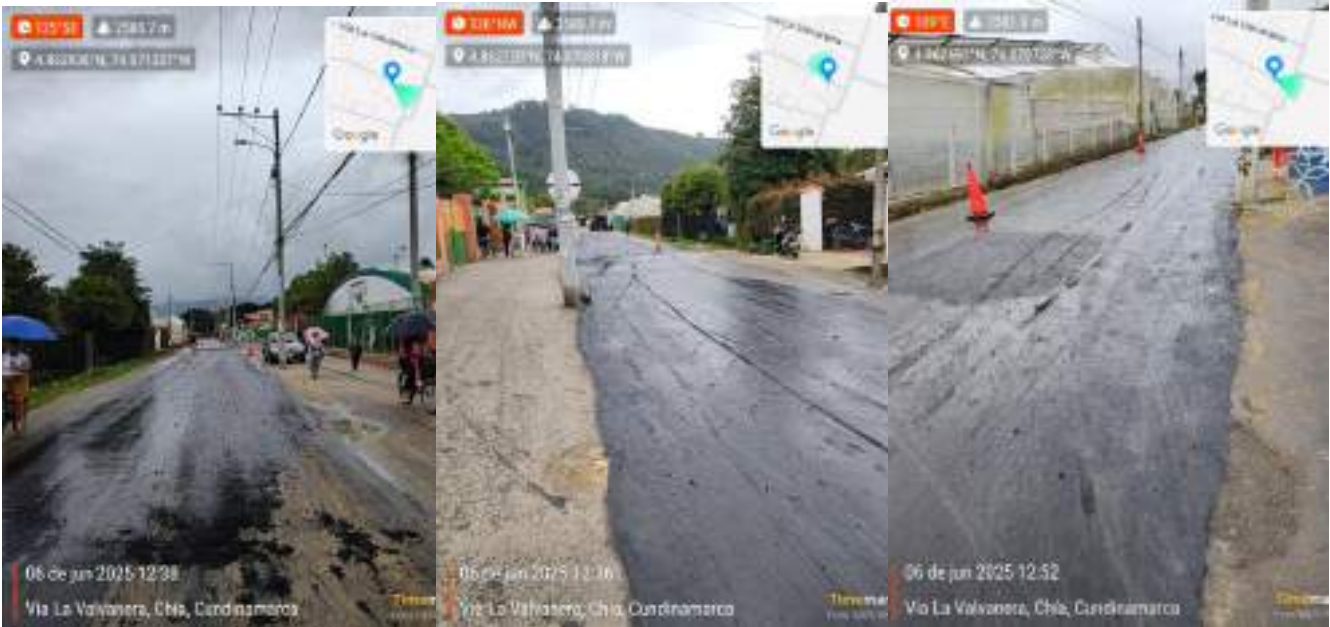

3.OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Apoyar en la elaboración de presupuestos de pavimento de vías y/o geotecnia de acuerdo a las necesidades de la Secretaria de Obras Públicas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Elaboración de presupuesto para el mantenimiento de vias urbanas y rurales del municipio de chía.

PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS								
ITEM	ITEM PRECIOS ICCU	ITEM PRECIOS INVIAS	NORMA	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
VIAS URBANAS								
1. REPARCHEO MANUAL M2								
1.1	3.4 ICCU - 2025 VIAS		INVIAS 365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km INCLUYE CORTE)	M3	0,3	\$ 190.964,00	\$ 57.289,20
1.2	NP-1			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO E INSTALACION MANUAL)	M2	1	\$ 141.727,76	\$ 141.727,76
1.3	3.6 ICCU - 2025 VIAS		INVIAS 421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 (EN DOS CAPAS)	M2	1	\$ 2.882,00	\$ 2.882,00
1.4	16.13 ICCU - 2025 CONSTRUCCION		INVIAS 330-22	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0,20	\$ 136.321,00	\$ 27.264,20
1.5	1.6 ICCU - 2024 VIAS		INVIAS 900-22	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	5,85	\$ 1.735,00	\$ 10.149,75
1.6	5.1 ICCU - 2024 VIAS			LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	0,67	\$ 5.294,00	\$ 3.529,33
1.7	5.2 ICCU - 2024 VIAS			MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	0,02	\$ 59.427,00	\$ 1.188,54
1.8	NP-2			IMPLEMENTACION SEÑALIZACION DE OBRA	GL	1,00	\$ 3.072.269,66	\$ 5.120
							COSTOS DIRECTOS	\$ 249.151,00
							AIU 30%	\$ 74.745,00
							COSTO TOTAL	\$ 323.896,00
2. REHABILITACION TRAMOS LARGOS M2								
2.1	3.1 ICCU - 2025 VIAS		460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-15 cm)	M2	1	\$ 7.811,00	\$ 7.811,00
2.2	3.10 ICCU - 2025 VIAS		INVIAS 451-22	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)(CON FINISHER)	M3	0,1	\$ 1.451.079,04	\$ 145.107,90
2.3	3.6 ICCU - 2025 VIAS		INVIAS 421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 EN DOS CAPAS	M2	1	\$ 2.882,00	\$ 2.882,00
2.4	16.13 ICCU - 2025 CONSTRUCCION		INVIAS 330-22	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0,2	\$ 136.321,00	\$ 27.264,20
2.5	6.1 ICCU - 2025 VÍAS		INVIAS 310-22	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1	\$ 1.147,00	\$ 1.147,00
2.6	1.6 ICCU - 2024 VIAS		INVIAS 900-22	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	5,85	\$ 1.735,00	\$ 10.149,75
2.7	5.1 ICCU - 2024 VIAS			LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	0,67	\$ 5.294,00	\$ 3.529,33
2.8	5.2 ICCU - 2024 VIAS			MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	0,02	\$ 59.427,00	\$ 1.188,54
2.9	4.13 ICCU - 2024 VIAS			NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	2,00	\$ 211.533,00	\$ 705,11
2.10	NP-1			NIVELACION DE SUMIDEROS	UN	4,00	\$ 159.594,00	\$ 1.063,96
2.11	NP-2			IMPLEMENTACION SEÑALIZACION DE OBRA	GL	1,00	\$ 3.072.269,66	\$ 5.120,45
							COSTOS DIRECTOS	\$ 205.969,00
							AIU 30%	\$ 61.791,00
							COSTO TOTAL	\$ 267.760,00
3.CONSTRUCCION DE VIA M2								
3.1	3.10 ICCU - 2025 VIAS		INVIAS 451-22	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0,1	\$ 1.451.079,04	\$ 145.107,90
3.2	3.6 ICCU - 2025 VIAS		INVIAS 421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 EN DOS CAPAS	M2	1	\$ 2.882,00	\$ 2.882,00
3.3	16.13 ICCU - 2025 CONSTRUCCION		INVIAS 330-22	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0,2	\$ 136.321,00	\$ 27.264,20
3.4	16.12 ICCU - 2025 CONSTRUCCION		INVIAS 320-22	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0,3	\$ 126.825,00	\$ 38.047,50
3.5	4.46 ICCU - 2025 VIAS		INVIAS 232-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1	\$ 12.900,00	\$ 12.900,00
3.6	3.22 ICCU - 2025 VIAS		INVIAS 230-22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	0,3	\$ 133.509,00	\$ 40.052,70
3.7	16.2 ICCU - 2025 CONSTRUCCION		INVIAS 210-22	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,9	\$ 21.200,00	\$ 19.080,00
3.8	6.1 ICCU - 2025 VÍAS		INVIAS 310-22	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1	\$ 1.147,00	\$ 1.147,00
3.9	1.6 ICCU - 2024 VIAS		INVIAS 900-22	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	18	\$ 1.735,00	\$ 30.449,25
3.10	ICUU			DERECHO DE BOTADERO	M3	0,9	\$ 7.419,00	\$ 6.677,10
3.11	5.1 ICCU - 2024 VIAS			LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	0,67	\$ 5.294,00	\$ 3.529,33
3.12	5.2 ICCU - 2024 VIAS			MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	0,02	\$ 59.427,00	\$ 1.188,54
3.13	4.13 ICCU - 2024 VIAS			NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	2	\$ 211.533,00	\$ 705,11
3.14	NP-1			NIVELACION DE SUMIDEROS	UN	4	\$ 159.594,00	\$ 1.063,96
3.15	NP-2			IMPLEMENTACION SEÑALIZACION DE OBRA	GL	1,00	\$ 3.072.269,66	\$ 5.120,45
							COSTOS DIRECTOS	\$ 335.215,00
							AIU 30%	\$ 100.565,00
							COSTO TOTAL	\$ 435.780,00

VIAS RURALES								
4. REPARCHEO DE ESTRUCTURA M2 (PUNTUAL)								
4.1	NP-2			LIMPIEZA DE VIAS INC BOTE DE ESCOMBROS	M2	1	\$ 6.505,14	\$ 6.505,14
4.2	3.4 ICCU - 2025 VIAS		INVIAS 365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km INCLUYE CORTE)	M3	0,1	\$ 190.964,00	\$ 19.096,40
4.3	3.6 ICCU - 2025 VIAS		INVIAS 421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	1	\$ 2.882,00	\$ 2.882,00
4.4	16.13 ICCU - 2025 CONSTRUCCION		INVIAS 330-22	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0,1	\$ 136.321,00	\$ 13.632,10
4.5				LECHADA ASFALTICA CON EMULSION 7.5 MM	M2	0,3	\$ 8.882,75	\$ 2.664,83
4.6	NP-3			LECHADA ASFALTICA CON EMULSION 7.5 MM	M2	1	\$ 8.882,75	\$ 8.882,75
4.7	4.13 ICCU - 2024 VIAS			NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	2	\$ 211.533,00	\$ 705,11
4.8	NP-1			NIVELACION DE SUMIDEROS	UN	4	\$ 159.594,00	\$ 1.063,96
4.9	ICUU			DERECHO DE BOTADERO	M3	0,2	\$ 7.419,00	\$ 1.483,80
4.10	5.1 ICCU - 2024 VIAS			LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	1	\$ 5.294,00	\$ 3.529,33
4.11	5.2 ICCU - 2024 VIAS			MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	0,02	\$ 59.427,00	\$ 1.188,54
							COSTOS DIRECTOS	\$ 61.634,00
							AIU 30%	\$ 18.490,00
							COSTO TOTAL	\$ 80.124,00
5. ADECUACION ESTRUCTURA O LECHADA ASFALTICA M2								
5.1	NP-2			LIMPIEZA DE VIAS INC BOTE DE ESCOMBROS	M2	1	\$ 6.505,14	\$ 6.505,14
5.2	6.1 ICCU - 2025 VÍAS			CONFORMACION CALZADA EXISTENTE (INC ESCARIFICADO Y COMPACTACION)	M2	1	\$ 1.147,00	\$ 1.147,00
5.3	16.13 ICCU - 2025 CONSTRUCCION		INVIAS 330-22	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0,2	\$ 136.321,00	\$ 27.264,20
5.4	3.24 ICCU - 2025 VÍAS			ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M2	1	\$ 12.039,40	\$ 12.039,40
5.5	NP-3			LECHADA ASFALTICA CON EMULSION 1.5 CM	M2	2	\$ 8.882,75	\$ 17.765,50
5.6	4.13 ICCU - 2024 VIAS			NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	2	\$ 211.533,00	\$ 705,11
5.7	NP-1			NIVELACION DE SUMIDEROS	UN	2	\$ 159.594,00	\$ 531,98
5.8	ICUU			DERECHO DE BOTADERO	M3	0,10	\$ 7.419,00	\$ 741,90
5.9	5.1 ICCU - 2024 VIAS			LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	0,67	\$ 5.294,00	\$ 3.529,33
5.10	5.2 ICCU - 2024 VIAS			MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	0,02	\$ 59.427,00	\$ 1.188,54
							COSTOS DIRECTOS	\$ 71.418,00
							AIU 30%	\$ 21.425,00
							COSTO TOTAL	\$ 92.843,00

4. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Asistir a las reuniones, comités y mesas de trabajo que se realicen, realizando el apoyo especializado en los procesos que adelante la secretaria de Obras Públicas y presentar al supervisor del contrato un informe en que se detalle el fin de la reunión y las conclusiones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 4.1 Comité recorrido de vías con personal de SOP
- 4.2 Seguimiento al mantenimiento de la maquinaria de la secretaria de obras públicas.
- 4.3 Mesa de trabajo con el contratista encargado de realizar el mantenimiento a la maquinaria de obras públicas.
- 4.4 Comité empréstito.

5. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Realizar y proyectar conceptos técnicos de las alternativas de intervención en las vías del municipio de acuerdo al previo diagnostico que se realice.

ITEM	MATERIAL DE LA VIA	UBICACIÓN	DIAGNOSTICO	ALTERNATIVA DE INTERVENCION
1	MDC-19	Vereda Yerbabuena Vía Colegio la Inmaculada (Sector Sindamanoy)	Mantenimiento correctivo. Presenta baches y hundimientos	Mantenimiento vial mediante reparcheo con MDC-19. consistente en corte de la zona afectada con cortadora de disco, retiro de escombros, compactacion de la sub rasante, imprimacion y suministro e instalacion de MDC-19
2	PAV EN FRIO	Camino Santa Barbara entre la Glorieta vía Chía-Cota (Sector Casa de la mujer) y Camino a la Lucerna - Vereda Fonqueta	Mantenimiento correctivo. Presenta baches y hundimientos	Mantenimiento vial para la recuperación de la superficie de rodadura en las diferentes zonas donde se encuentra afectada. Corte de la superficie, excavacion y suministro instalacion de material de fresado o reciclado.
3		Camino El Cerro entre Caminos el Eden y Los Lavaderos (sector Kalamary) - Vereda Cerca de Piedra		
4		Camino a La lucerna entre camino santa barbara y Jardin Infantil colsubsidio		
5		Vía Resguardo Indígena entre Jardín Infantil Big Talents y Cancha de Futbol - Vereda Cerca de Piedra.		
6		Calle 26 (camino la Floresta) entre carreras 9 y 2 Este		
7		Vereda Fagua Sector San Miguel		
8		Carrera 11 entre Caminos Puente Peralta y Costa Rica		
9		Calle 29 entre Carreras 2 Este y 9		
10		Carrera 11 entre Calle 25 y Camino Guanata		
11		Sector punto de Encuentro - Vereda Tiquiza sector Cuatro Esquinas		
12		Via Colegio de Fagua entre Caminos Guanata y La Leonor		
13		Carrera 11 entre Caminos Guanata y Costa Rica		
14		Carrera 11 entre Calle 29 y camino Guanata		
15		Camino El Cerro entre Caminos de Alejandria y El Volador		
16		Calle 11 La Union entre Avenida Chilacos y Vía a la Lucerna		
17		Camino El cerro entre Camino La Leonor y Vía a Tabio		
18		Camino El Volador entre Vía a la Lucerna y camino El Cerro		
19		Camino El Cerro entre Polideportivo Tiquiza y Camino de Alejandria		
20		Camino El Cerro entre Caminos las Eses y La Leonor		
21	SELLO SLURRY	Camino El Chorro entre Cuatro Esquinas y camino Alejandria	Mantenimiento preventivo	APLICACIÓN DE SLURRY
22		Via Tabio (CALLE 19) entre sector Cuatro Esquinas y Rio Frio		
23		Camino Santa Barbara entre la Glorieta vía Chía-Cota (Sector Casa de la mujer) y Camino a la Lucerna - Vereda Fonqueta		
24		Vía a la Lucerna entre los caminos a Tenjo y Camino Santa Barbara (Vereda Fonqueta		
25		Camino a la Lucerna entre camino Santa Barbara y Jardin Infantil Colsubsidio (Vereda Fonqueta)		
26		Camino El Cerro entre Caminos el Eden y Los Lavaderos (sector Kalamary) - Vereda Cerca de Piedra		
27		Via Colegio de Fagua entre Caminos Guanata y La Leonor		
28		Camino El Cerro entre Caminos de Alejandria y El Volador		
29		Calle 11 La Union entre Avenida Chilacos y Vía a la Lucerna		
30		Camino El Volador entre Vía a la Lucerna y camino El Cerro		

6 OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Brindar acompañamiento técnico en la revisión de los estudios y documentos previos, análisis del sector y demás soportes, de los procesos de contratación que adelante la Secretaria de Obras Públicas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para este compromiso, no se realizaron actividades propias de la obligación.

7 OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Apoyar en las actividades de mantenimientos preventivos y correctivos en el espacio público y vías del Municipio de Chía.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En este periodo no se realizaron actividades relacionadas con espacio público.

8. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA


Las demás que se coordinen con el supervisor de acuerdo con el objeto contractual y alcance del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

8.1 Elaboración y seguimiento a la programación de mantenimiento vial 2025 del municipio de chía

ZONA URBANA Y RURAL					MANTENIMIENTO EN ASFALTO MDC-19			MAYO	
VEREDA	CUADRANTE	SUB CUADRANTE	NOMBRE DE LA VÍA		CUBRIMIENTO				
V-YB			V-YB BAJA ENCENILLOS DE SINDAMANÓY - SECTOR COLEGIO LA INMACULADA Q PASA POR SINDAMANÓY Y COLEGIO LA CUMBRE A SALIR A LA CENTRAL DEL NORTE		CORTE Y RETIRO DE ASFALTO FATIGADO CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, DEMOLICION Y , APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA MDC-19				
ZU			CARRERA 5 CON CALLE 2 (VTE A COTA) HACIA EL NORTE		CORTE Y RETIRO DE ASFALTO FATIGADO CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO,				
ZONA RURAL					MANTENIMIENTO EN FRIO			MAYO	
VEREDA	CUADRANTE	SUB CUADRANTE	NOMBRE DE LA VÍA		CUBRIMIENTO				
V-Bj	1	2	CAMINO LA FLORESTA (CALLE 26) DE CRA 9 AL ORIENTE HASTA LA CRA 2 ESTE		SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESADO Y/O RECICLADO. INC. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, RETIRO DE SOBRANTES, EXTENDIDA Y COMPACTACION				
V-Tq	1	2	VIA A COLEGIO DE FAGUA (CAMINO OLAYA HERRERA) ENTRE CAMINO LA LEONOR Y SECTOR LA TASCA ESPAÑOLA (RESTAURANTE LA CIGALA)		SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESADO Y/O RECICLADO. INC. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, RETIRO DE SOBRANTES, EXTENDIDA Y COMPACTACION				
V-Fq	1	1	CAMINO EL CHORRO ENTRE CAMINO LAS ESES Y EL CAMINO ALEJANDRIA		SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESADO Y/O RECICLADO. INC. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, RETIRO DE SOBRANTES, EXTENDIDA Y COMPACTACION				
V-Fg	1	2	VIA CAMINO EL CERRO DE PORTADA FLOREZ MG HACIA EL NORTE HASTA EL LIMITE CON CAJICA		SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESADO Y/O RECICLADO. INC. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, RETIRO DE SOBRANTES, EXTENDIDA Y COMPACTACION				
V-Tq	3	1	CALLE 19 (VIA A TABIO) ENTRE RIO FRIO Y SECTOR CUATRO ESQUINAS		SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESADO Y/O RECICLADO. INC. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, RETIRO DE SOBRANTES, EXTENDIDA Y COMPACTACION				
V-Fg			SECTOR SAN MIGUEL		SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESADO Y/O RECICLADO. INC. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, RETIRO DE SOBRANTES, EXTENDIDA Y COMPACTACION				
V-Fq	3	4	CAMINO SANTA BARBARA ENTRE VIA A COTA (GLORIETA) Y CAMINO LA LUCERNA		SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESADO Y/O RECICLADO. INC. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, RETIRO DE SOBRANTES, EXTENDIDA Y COMPACTACION				
V-Fq	3	1	CAMINO LA LUCERNA ENTRE CAMINO LA CARLINA Y CAMINO SANTA BARBARA (DE CAMINO SANTA BARBARA HASTA JARDIN INFANTIL COLSUBSIDIO)		SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESADO Y/O RECICLADO. INC. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, RETIRO DE SOBRANTES, EXTENDIDA Y COMPACTACION				
V-Bj			CARRERA 11 ENTRE CAMINO DE COSTA RICAY PUENTE PERALTA		SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESADO Y/O RECICLADO. INC. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, RETIRO DE SOBRANTES, EXTENDIDA Y COMPACTACION				
V-Bj			CARRERA 11 ENTRE CALLE 25 (CAMINO EL DARIEN) Y CAMIO GUANATA						
V-Tq	2	4	VIA SECTOR -ARTESANIAS - EL PUNTO DE ENCUESTRO, ENTRE VIA A COLEGIO DE FAGUA (OLAYA HERRERA) Y SECTOR LOS SOCHA. ES DECIR DE LA VIA A COLEGIO DE FAGUA HACIA EL W		SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESADO Y/O RECICLADO. INC. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, RETIRO DE SOBRANTES, EXTENDIDA Y COMPACTACION				
			VIA COLEGIO DE FAGUA ENTE CAMINOS GUANATA A CAMINO LA LEONOR (INC CAMINO GALICIA)						
			OTRAS VIAS						
ZU			CALLE 23 ENTRE CARRERA 9 Y 3		LIIMPIEZA DE LA VIA, SUMINISTRO E INSTALACION B-400 Y/O ASFALTO RECICLADO				
			Carrera 5 entre Calles 21 (Avenida Chilacos) y Calle 23						
ZONA URBANA Y RURAL					APLICACIÓN DE SLURRY			MAYO	
VEREDA	CUADRANTE	SUB CUADRANTE	NOMBRE DE LA VÍA		CUBRIMIENTO				
V-Fq	1	1	CAMINO EL CHORRO ENTRE EL CAMINO LAS ESES Y SECTOR QUEBRADA TIQUIZA		APLICACIÓN CAPA DE SLURRY SEAL			1	
V-Tq	3	2	CAMINO EL CHORRO ENTRE SECTOR QUEBRADA TIQUIZA Y CUATRO ESQUINAS		APLICACIÓN CAPA DE SLURRY SEAL			1	
V-Fq	1	1	CAMINO EL CHORRO ENTRE CAMINO LAS ESES Y EL CAMINO ALEJANDRIA		APLICACIÓN CAPA DE SLURRY SEAL			1	
V-Fq	3	4	CAMINO SANTA BARBARA ENTRE VIA A COTA (GLORIETA) Y CAMINO LA LUCERNA		SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESADO Y/O RECICLADO. INC. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, RETIRO DE SOBRANTES, EXTENDIDA Y COMPACTACION				1
V-Tq			CALLE 19 (CAMINO A TABIO) ENTRE RIO FRIO Y SECTOR CUATRO ESQUINAS		APLICACIÓN CAPA DE SLURRY SEAL				1
ZONA RURAL					MANTENIMIENTO EN RECEBO			MAYO	
VEREDA	CUADRANTE	SUB CUADRANTE	NOMBRE DE LA VÍA		CUBRIMIENTO				
V-CP	1	7	VIA RESGUARDO INDIGENA		SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESADO Y/O RECICLADO. INC. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, RETIRO DE SOBRANTES, EXTENDIDA Y COMPACTACION				

8.2 Apoyo a la secretaria de obras públicas en el levantamiento de información de la infraestructura en plataformas digitales (mantenimiento de vías.

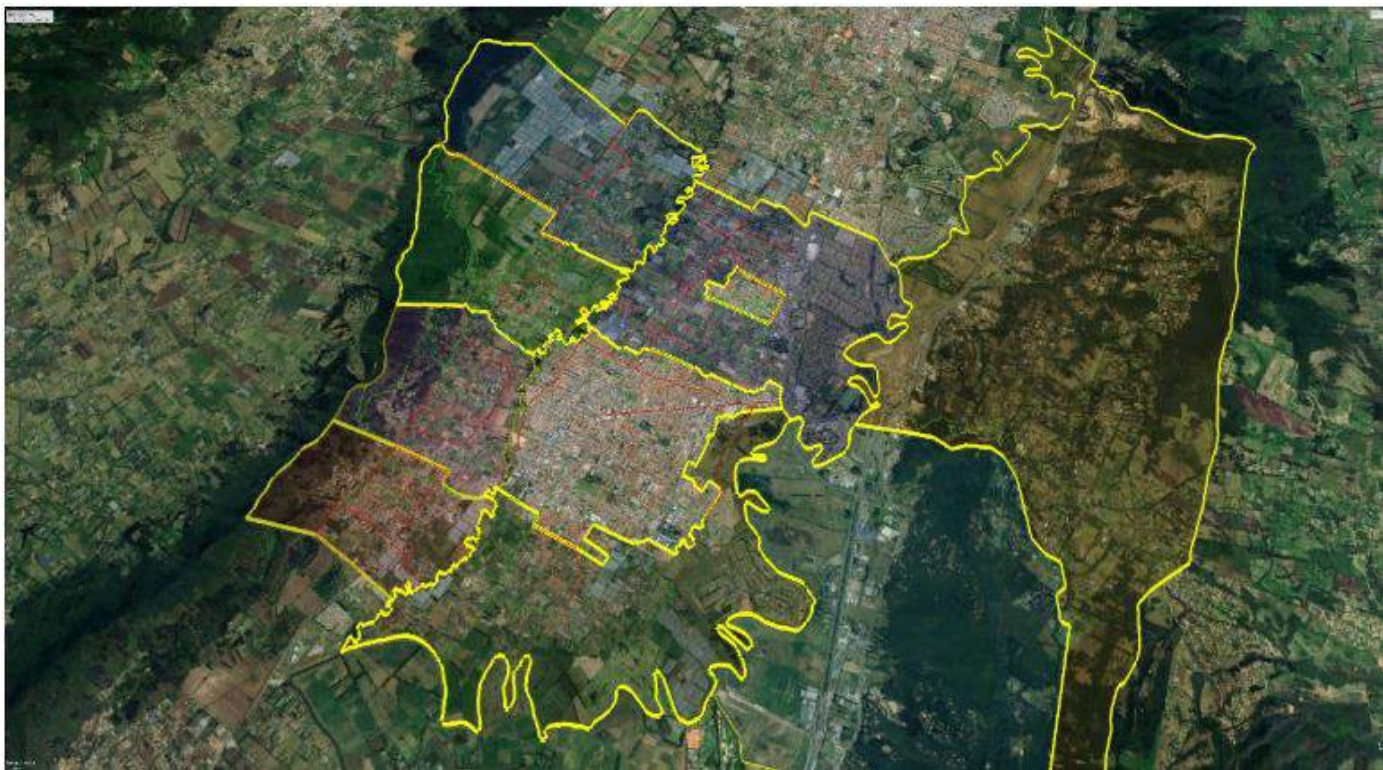

8.3 Apoyo a respuesta oficios allegados a S.O.P.



correo enviado a dirección financiera el día 16 de junio de 2025 a
radicacioncuentas@chia.gov.co con copia a Jennifer.hueso@chia.gov.co

Si se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma del contratista



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIRIQUÍ

PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

ACTA DE REUNION

CÓDIGO

SIG-FT-01-V3

PAGINAS

1 de 6

PROCESO.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: CARLOS ANDRÉS MANRIQUE

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

- ☐ Consejo _____
- ☐ Comité _____
- ☐ Reunión _____
- ☐ Otro _____

ACTA N°	FECHA JUNIO 2025			
LUGAR	VIAS MUNICIPIO			
ASISTENTES	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	JOHANA G CHAMORRO	30.231.492	PROFESIONAL OPS	jgchamorro@chiriqui.gov.co
	CARLOS A MANRIQUE	12.278.322	PROFESIONAL OPS	
	CARLOS A PAEZ	80.497.699	PROFESIONAL OPS	
INVITADOS	DIEGO ALVARADO	1.072.663.494	PROFESIONAL OPS	
	JUAN CAMILO CASTELLANOS	1.072.713.145	PROFESIONAL OPS	

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

INFORMACION DE MAQUINARIA

VISITA TECNICA A VIAS A INTERVENIR A NIVEL URBANO Y RURAL

2. ORDEN DEL DÍA

1. INFORMACION DE MAQUINARIA A UTILIZAR Y ESTADO DE LA MISMA
2. RECORRIDO DE VIAS A INTERVENIR
3. CONCEPTO TECNICO PARA SU INTERVENCION
4. CONCLUSIONES



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIRIQUÍ

PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

ACTA DE REUNION

CÓDIGO SIG-FT-01-V3

PAGINAS 3 de 6

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

3. Motoniveladora CAT



4. Se realiza recorrido de vías a intervenir
5. Se determina los daños presentes en las vías.



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIRIQUÍ

PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

ACTA DE REUNION

CÓDIGO

SIG-FT-01-V3

PAGINAS

5 de 6

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Via Colegio de Fagua entre Guanata y La Leonor



4. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN




1. Mantenimiento VIAL DE PAVIMENTO EN FRIO
2. Mantenimiento consistente en limpieza de la vía, escarificado con motoniveladora, suministro asfalto reciclado, extendida, conformación y compactación
3. Aplicación de SELLO SLURRY - 1ª Capa - Via Colegio de Fagua entre Guanata y La Leonor
4. En tramos de intervención largos recomendable revisar pendientes, sumideros, vallados entre otros, para conducir el agua y evitar empozamientos.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	6 de 6

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

5. ANEXOS

6. COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Seguimiento al mantenimiento vial	Profesionales OPS	Junio/2025
Seguimiento a maquinaria	Profesional maquinaria	Junio/2025

FIRMAS		
 C. 804 978999  C. 1072713145	 C. 1072665494	  OPS / APOYO AL PREGONTO

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 4

PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: CARLOS ANDRES MANRIQUE

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

☐ Consejo _____
☐ Comité SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO VIAL Y ESPACIO PÚBLICO
☐ Reunión: _____
☐ Otro: _____

ACTA N°			FECHA	MAYO 2025	
LUGAR	VIAS MUNICIPIO				
ASISTENTES	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	
	JOHANA G CHAMORRO	30.231.492	PROFESIONAL OPS		
	CARLOS A MANRIQUE	12.278.332	PROFESIONAL OPS		
	CARLOS A PAEZ	80.497.699	PROFESIONAL OPS	Ing Carlos Paez Ejército-1/12	
	DIEGO ALVARADO	1.072.663 494	PROFESIONAL OPS		
INVITADOS					

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

VISITA TECNICA A VIAS A INTERVENIR

2. ORDEN DEL DÍA

1. RECORRIDO DE VIAS A INTERVENIR
2. CONCEPTO TECNICO PARA SU INTERVENCION
3. CONCLUSIONES



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIRIQUÍ

PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO

SIG-FT-01-V3

PAGINAS

3 de 4

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Calle 26 CAMINO LA FLORESTA





4. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

1. En la vía a Tabio, se presenta socavación de la vía. Por lo que se determina excavar y rellenar con material granular debidamente compactado.
2. Vía Tabio entre Cuatro Esquinas y Río, disponible para Aplicación sello slurry
3. Calle 26 camino la floresta, Mantenimiento consistente en limpieza de la vía, escarificado, suministro de asfaltita, extendida, conformación y compactación
4. En tramos de intervención largos recomendable revisar pendientes, sumideros, vallados entre otros, para conducir el agua y evitar empozamientos.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIRIQUÍ	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	4 de 4

5. ANEXOS

6. COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Seguimiento al mantenimiento vial	Profesionales OPS	MAYO-2025

FIRMAS		
 cc.30497699	 Diego Alvarado cc 1072663494	 Carlos
	 Carlos OPS / Apoyo administrativo	
